







Phasage


Phase 1

Durée : 5 semaines + pause
COVID 19

du 17 février 2020
au 5 mai 2020

Légende:

-  Travaux
-  Circulation bidirectionnel
-  Circulation unidirectionnel
-  Feu de circulation

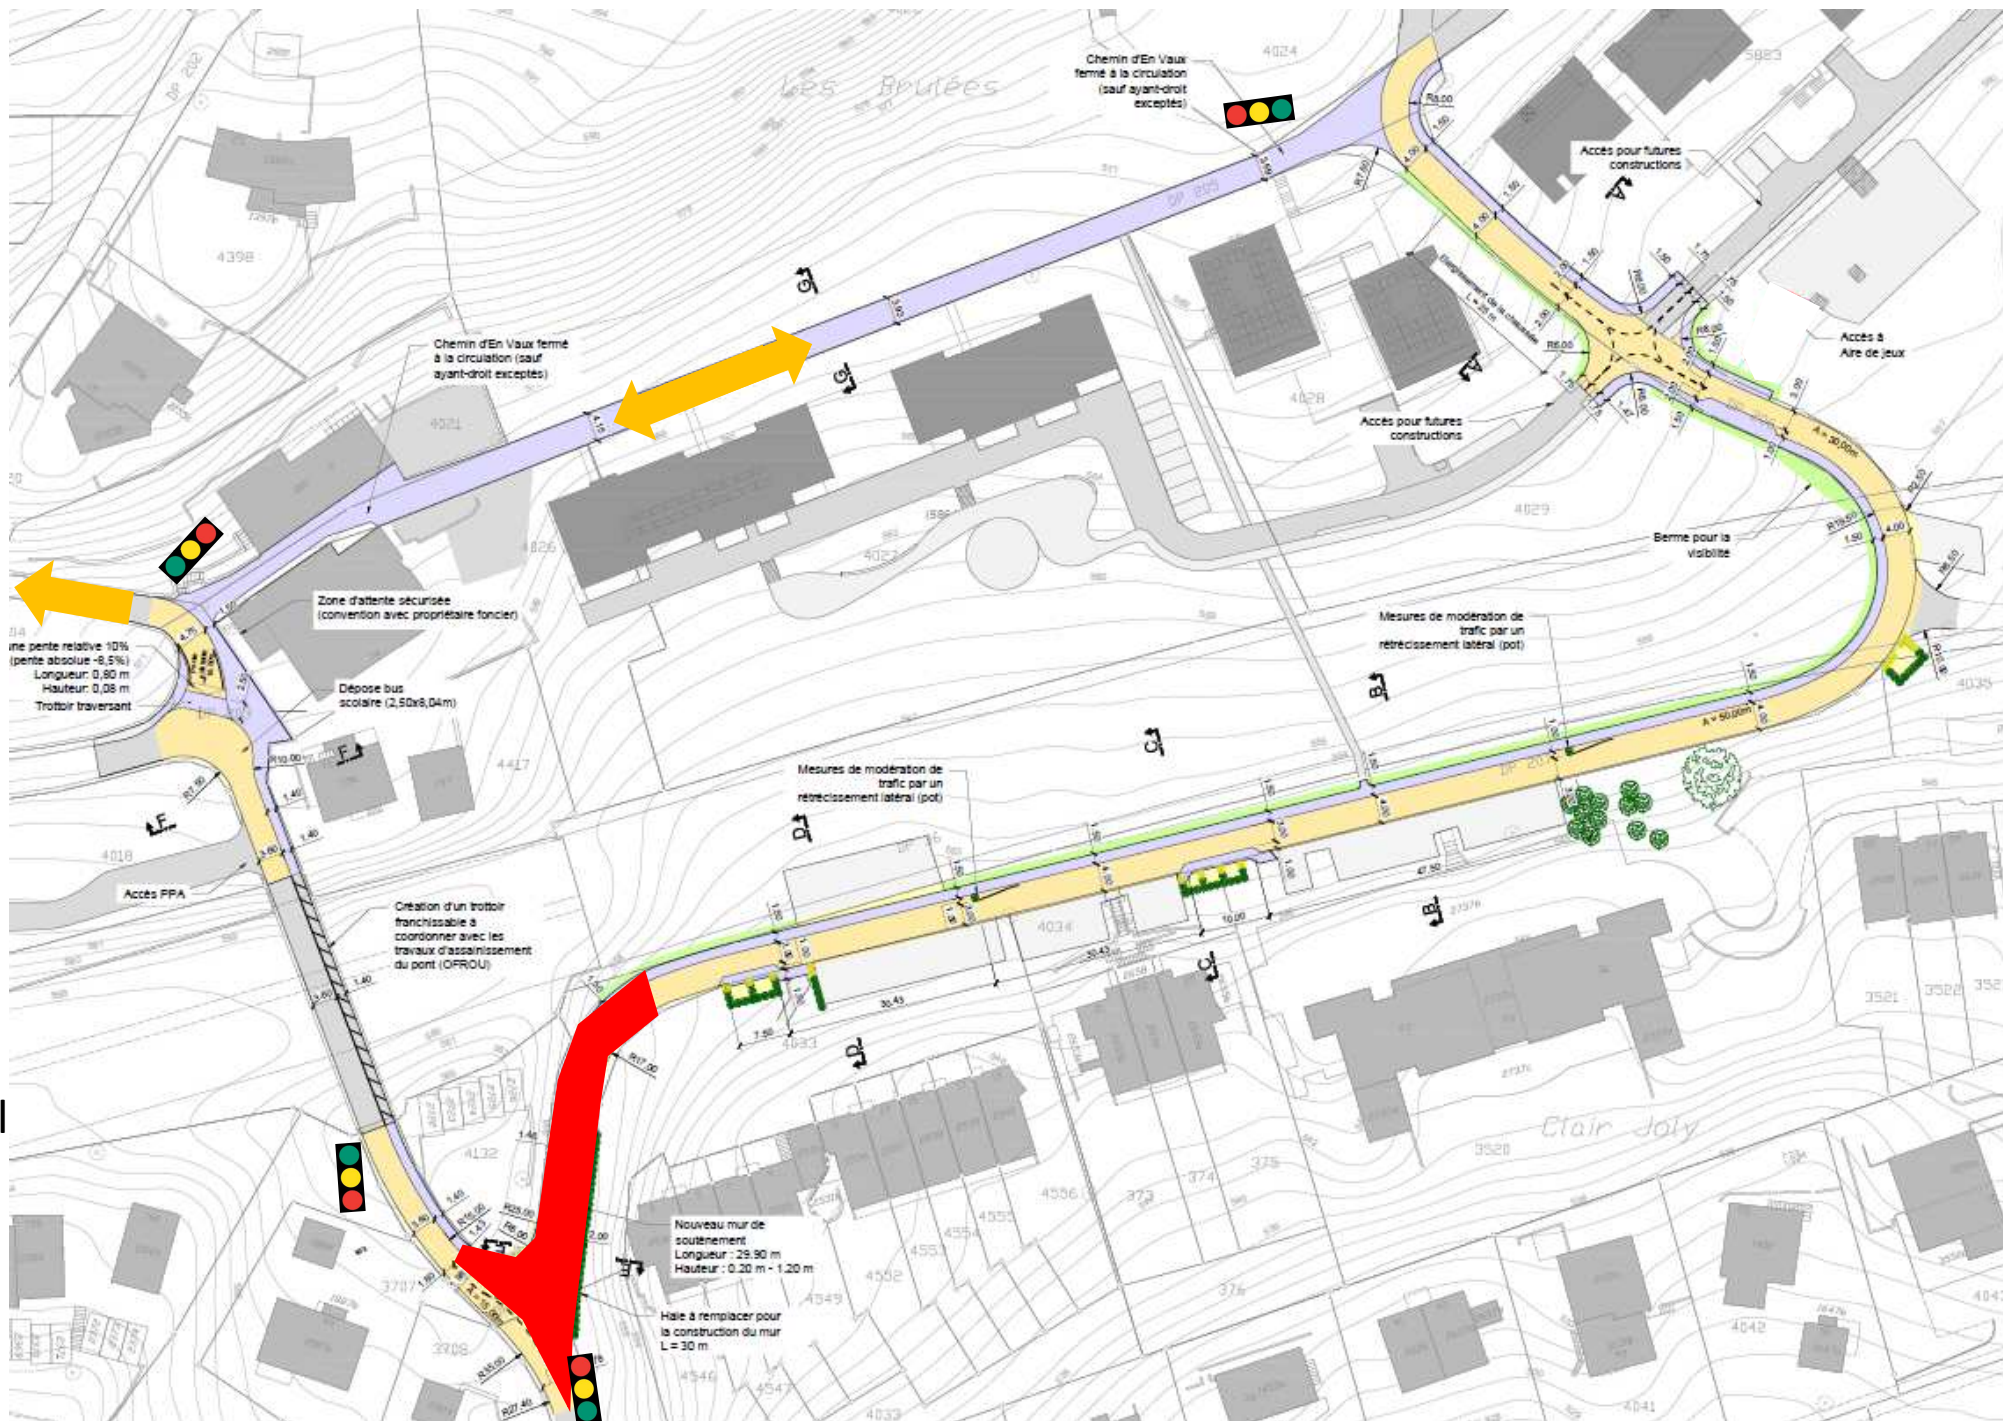






Phasage


Phase 2.1

Durée : 3 semaines

du 6 mai 2020
au 29 mai 2020

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

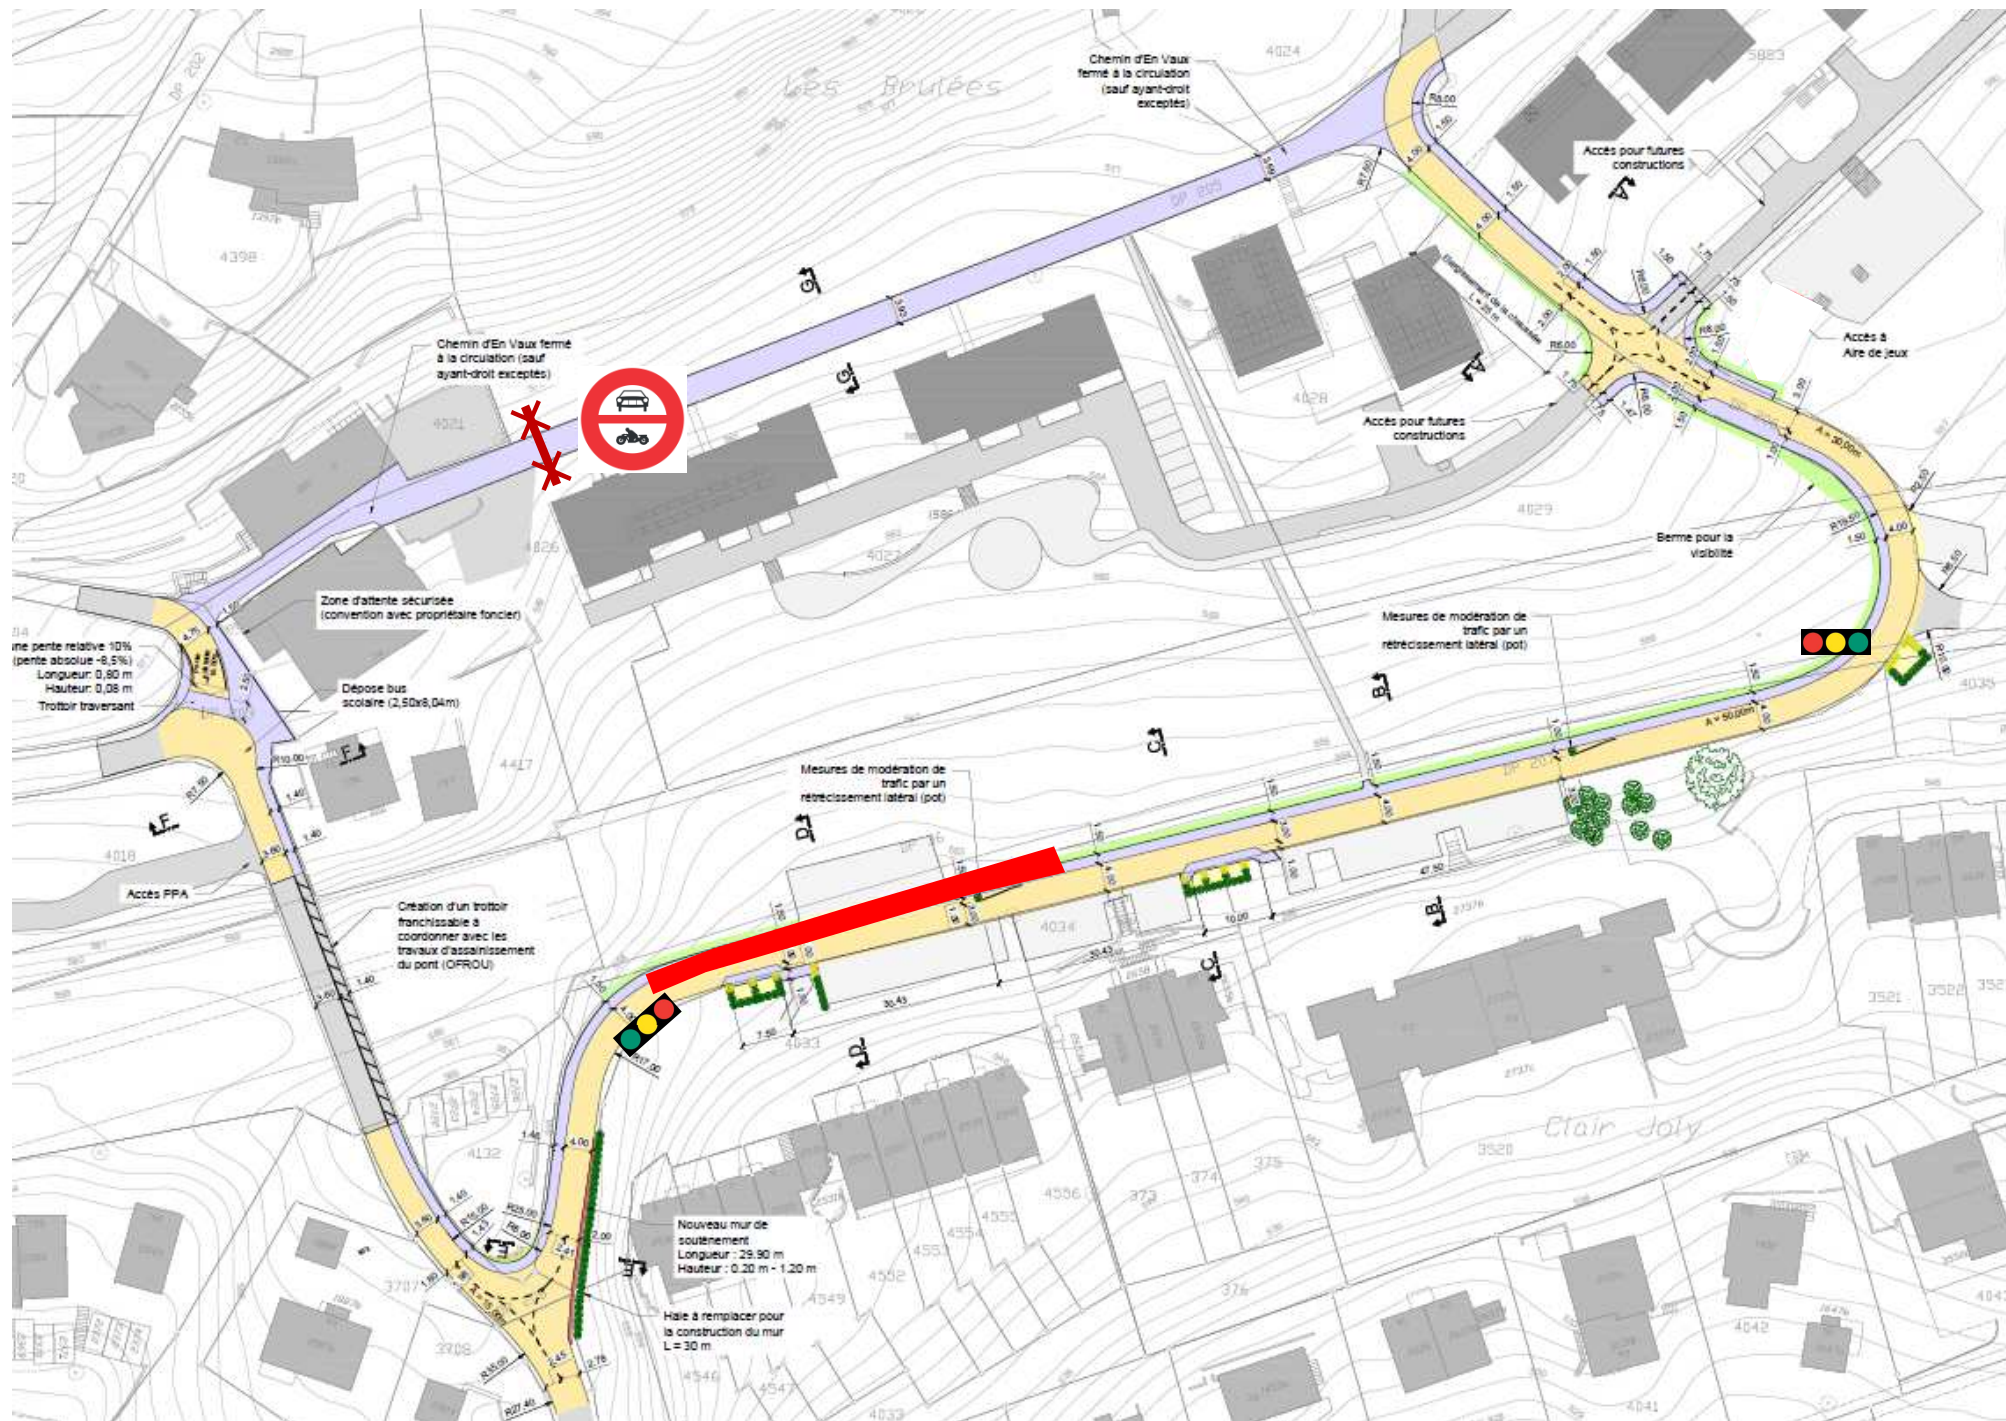



Commune
de Lutry




Phasage


Phase 2.2

Durée : 4 semaines

du 2 juin 2020
au 19 juin 2020

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

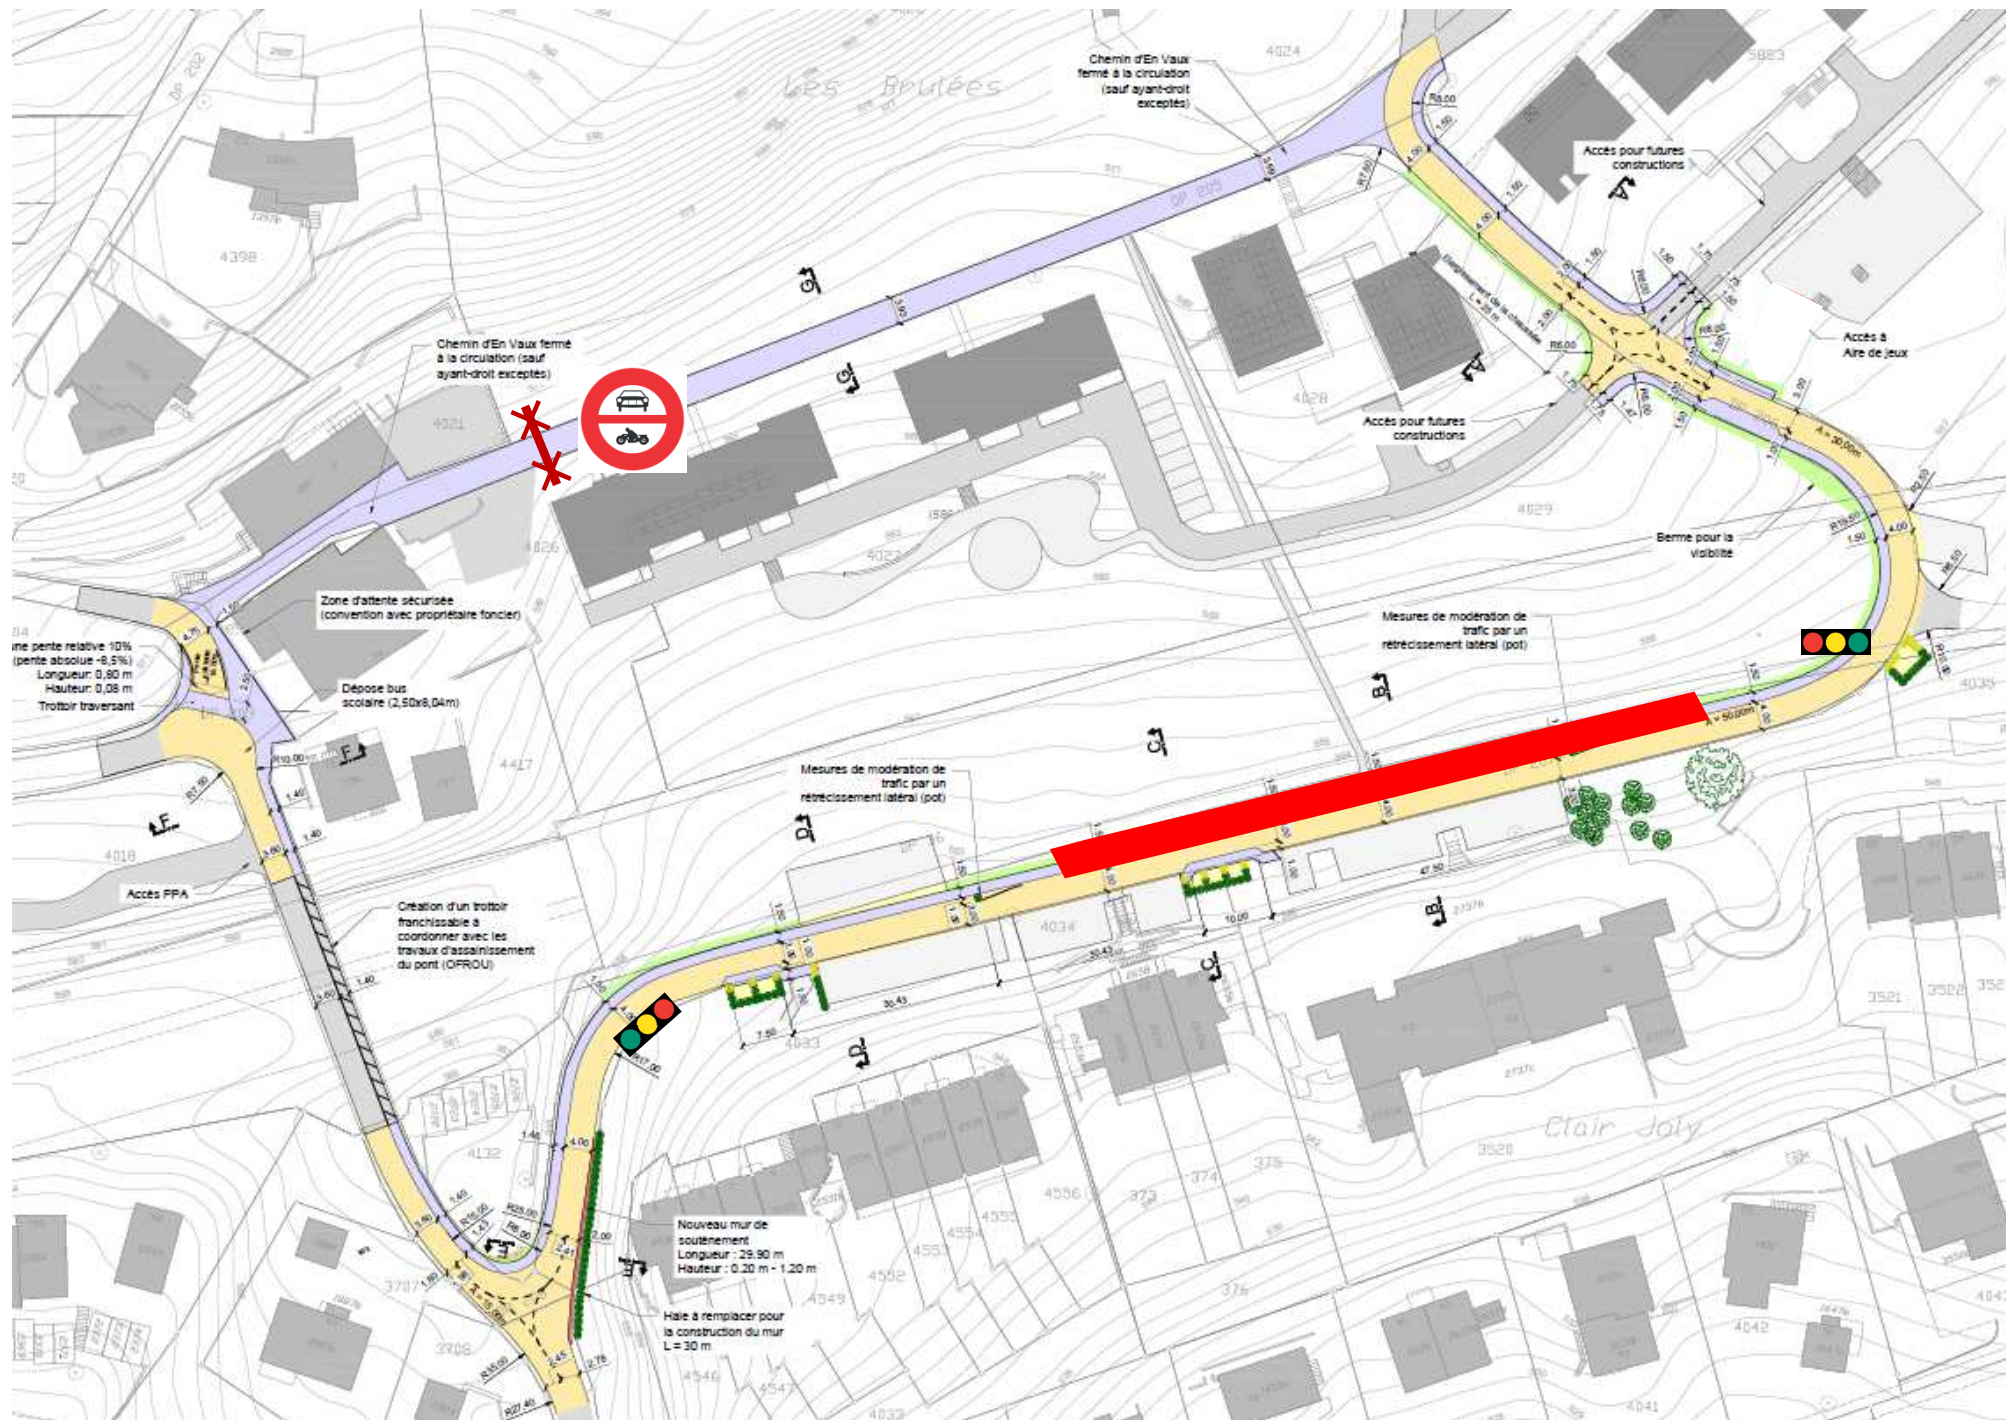






Phasage


Phase 3.1

Durée : 2 semaines

du 22 juin 2020
au 24 juillet 2020

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

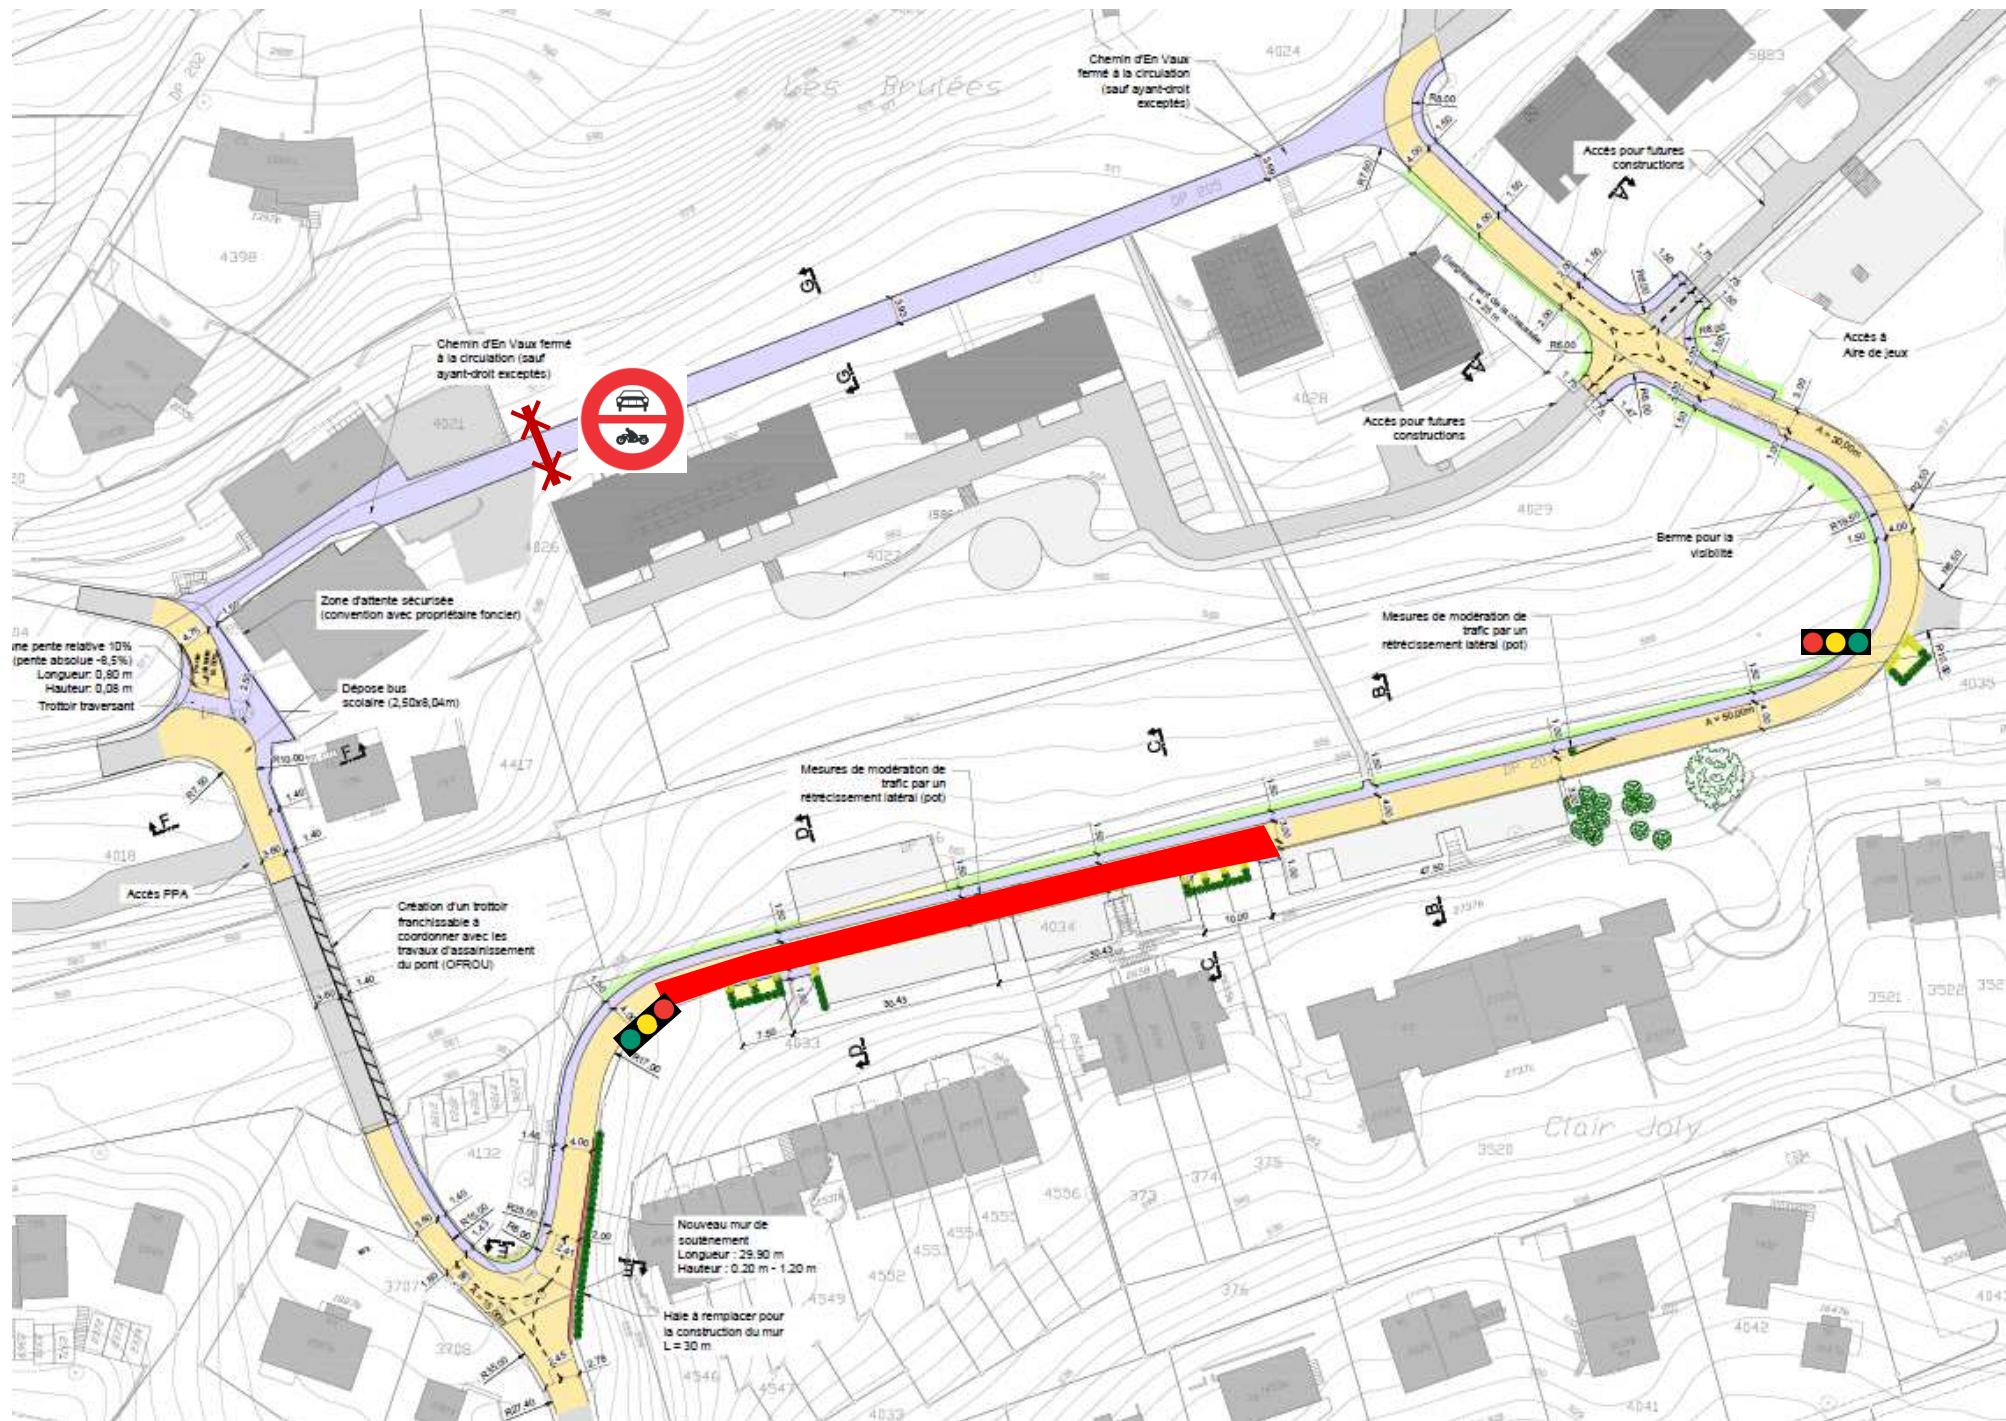



Commune
de Lutry




Phasage


Phase 3.2

Durée : 2 semaines

du 22 juin 2020
au 24 juillet 2020

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

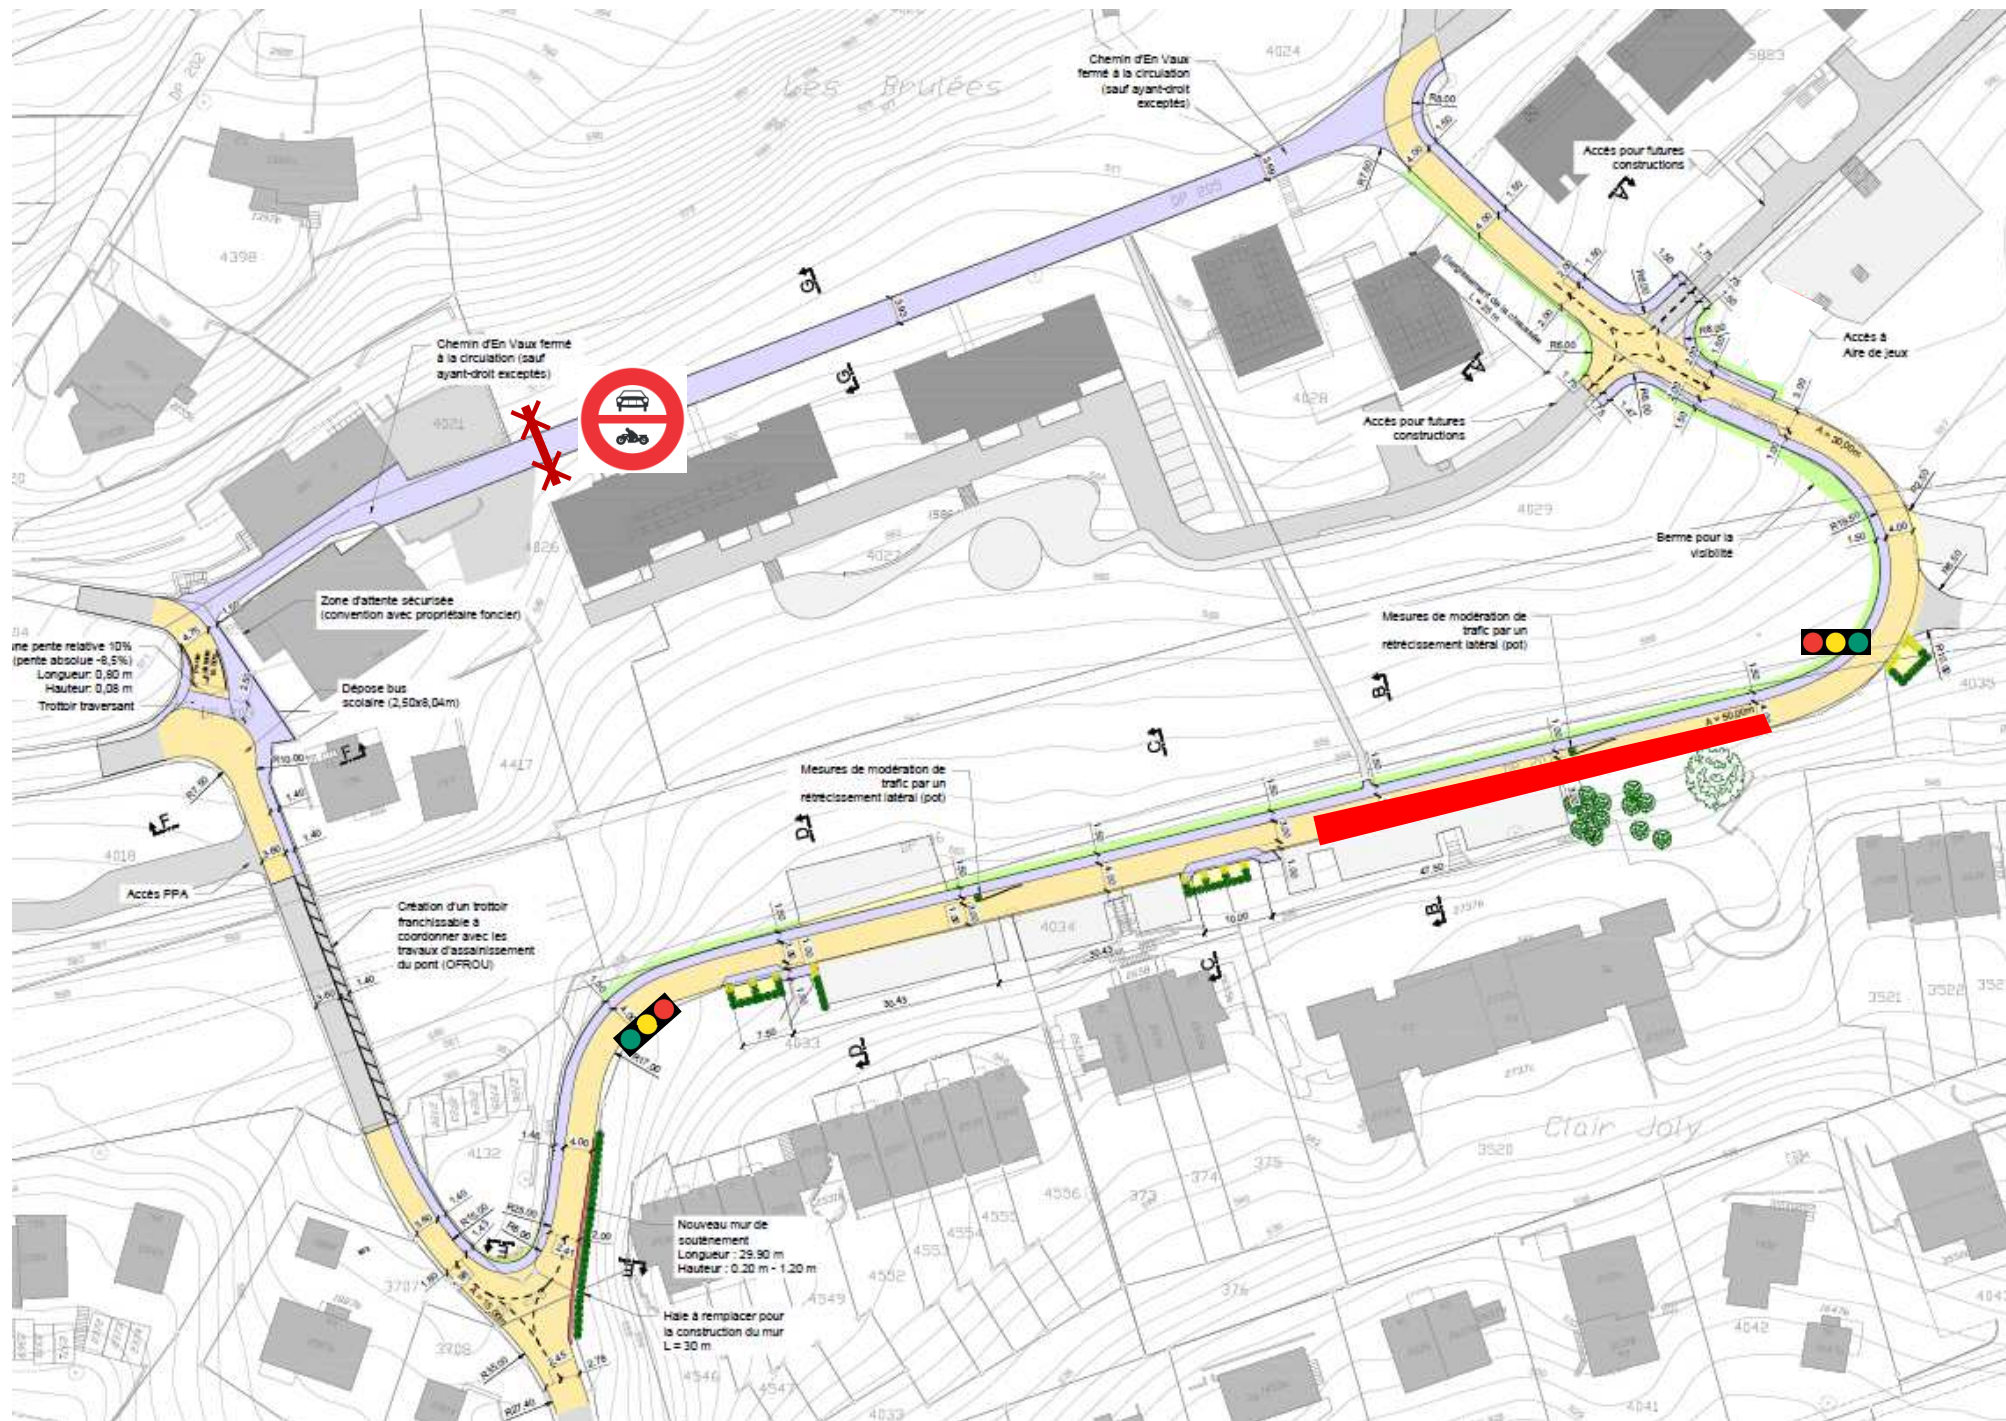




Commune
de Lutry

Phasage

Vacances été

Durée : 3 semaines

**du 24 juillet 2020
au 17 août 2020**

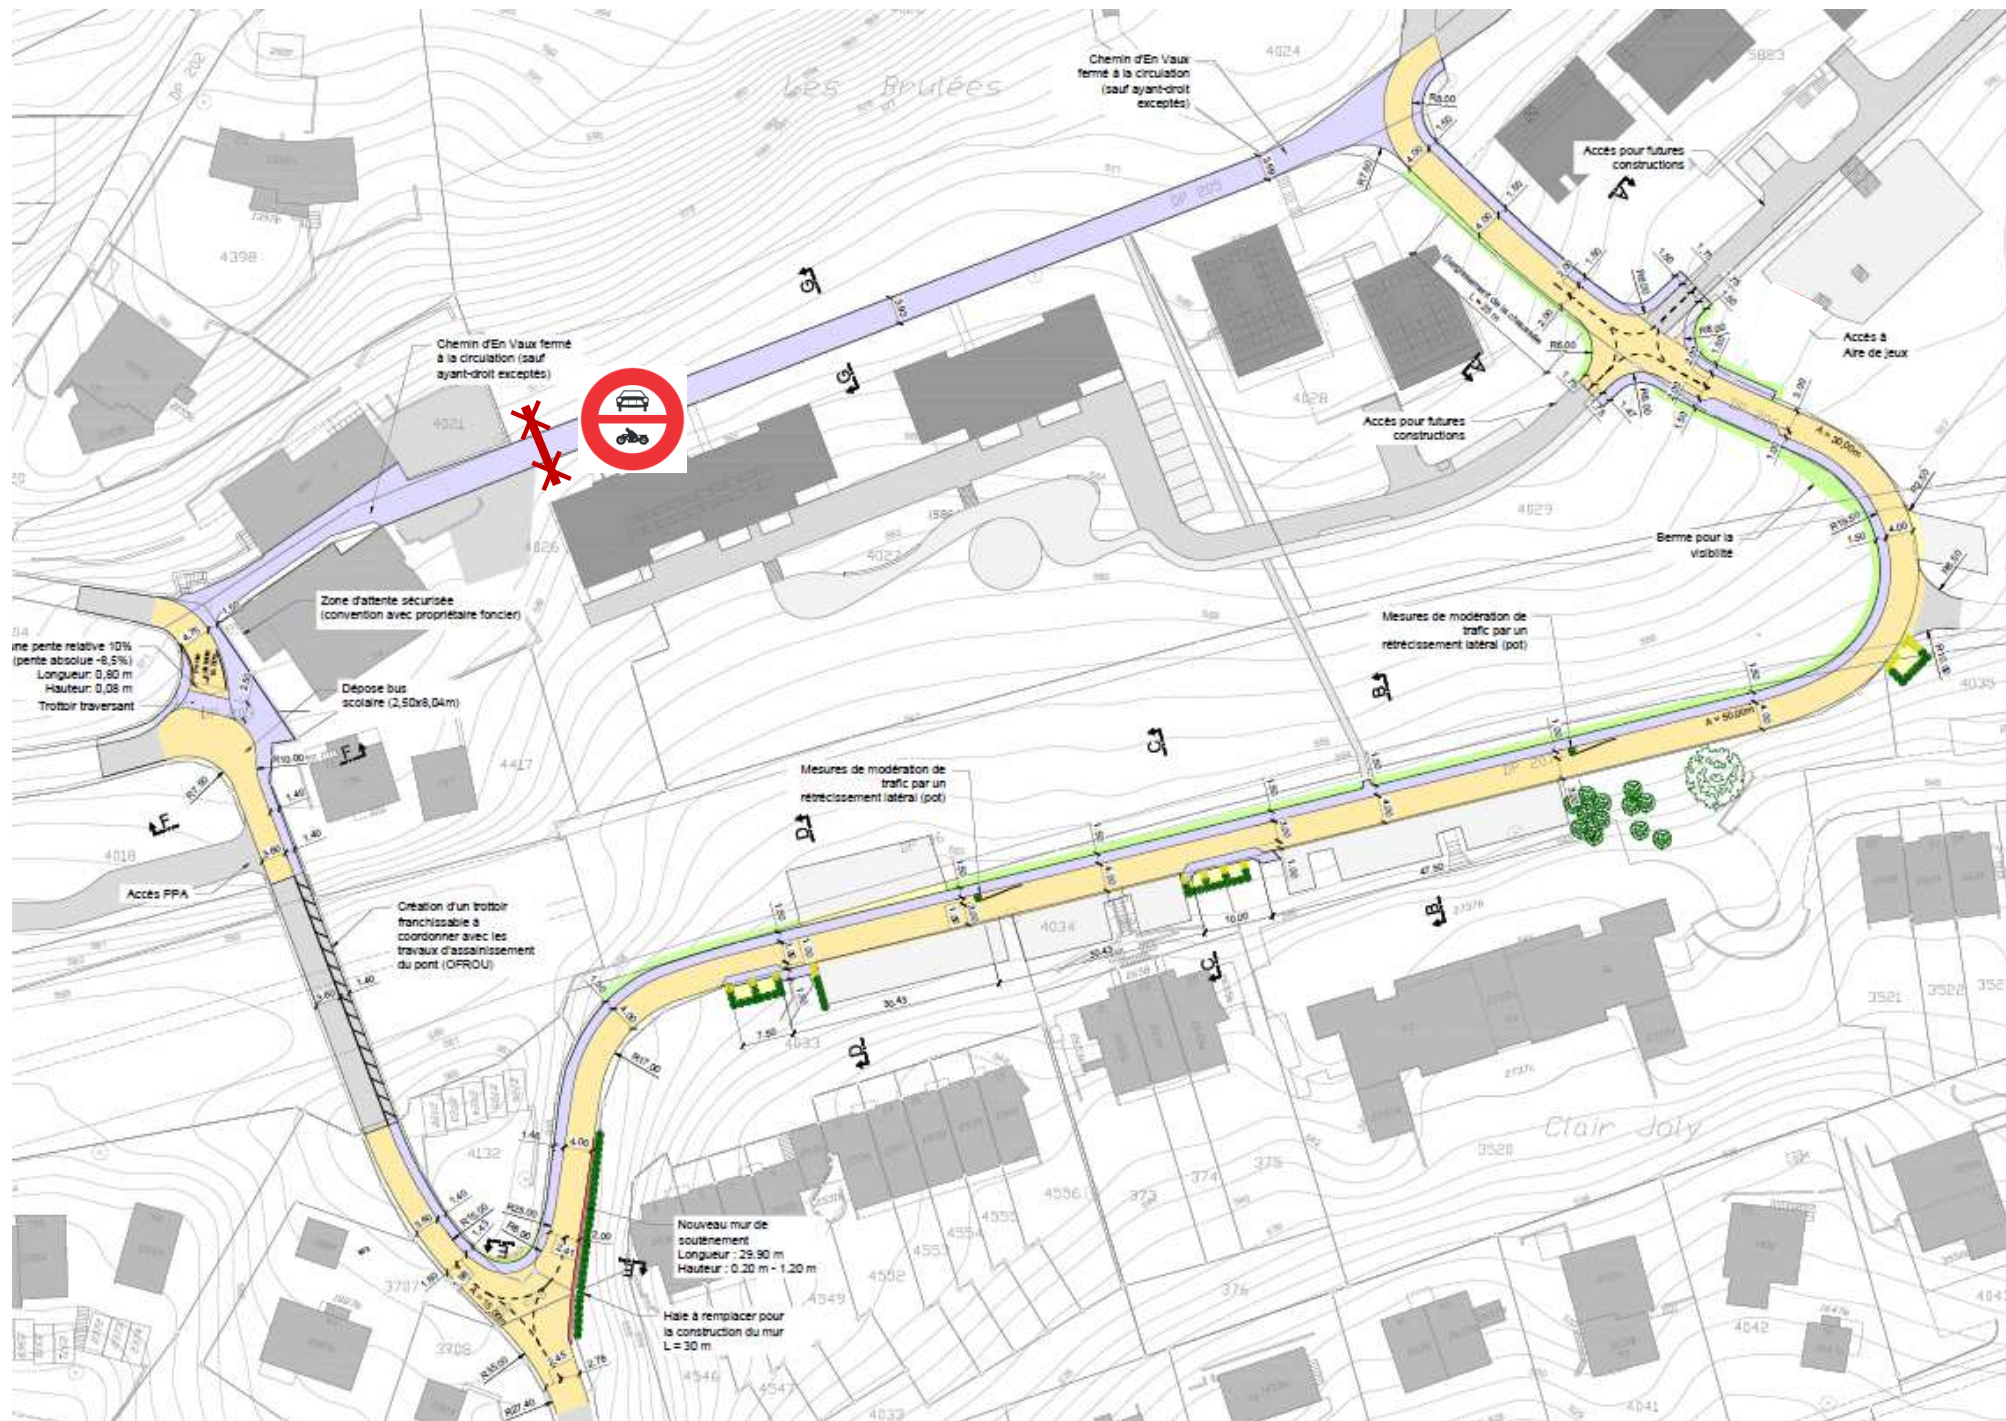






Phasage


Phase 3.3

Durée : 3 semaines

du 17 août 2020
au 9 septembre 2020
(date approximative)

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

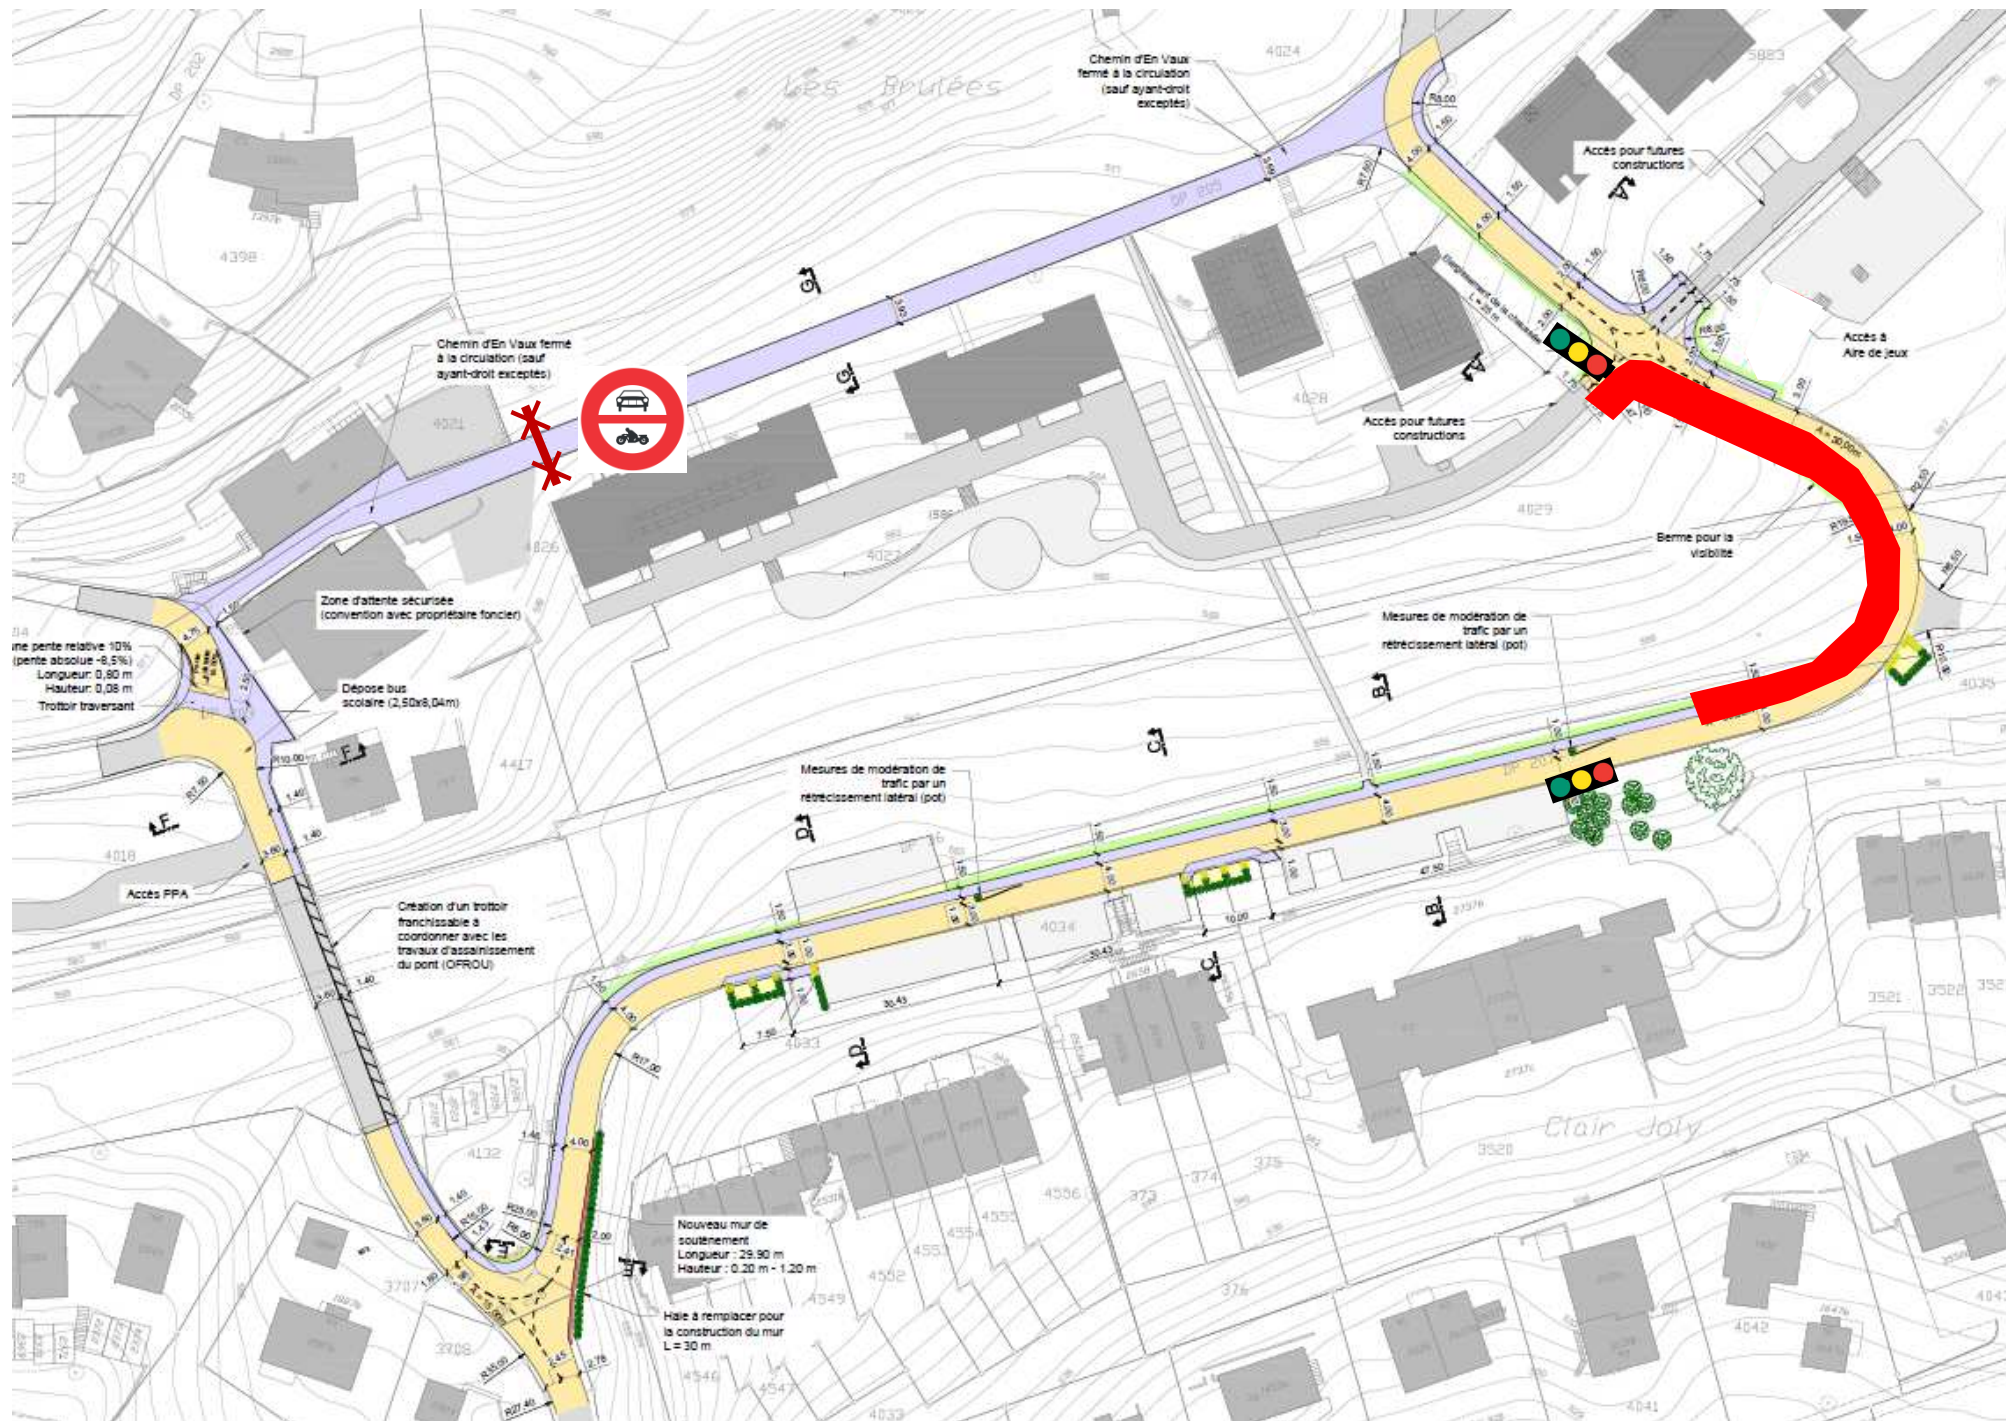



Commune
de Lutry

Phasage




Phase 3.4


Durée : 3 semaines

*du 10 septembre 2020
au 2 octobre 2020*

(dates approximatives)

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

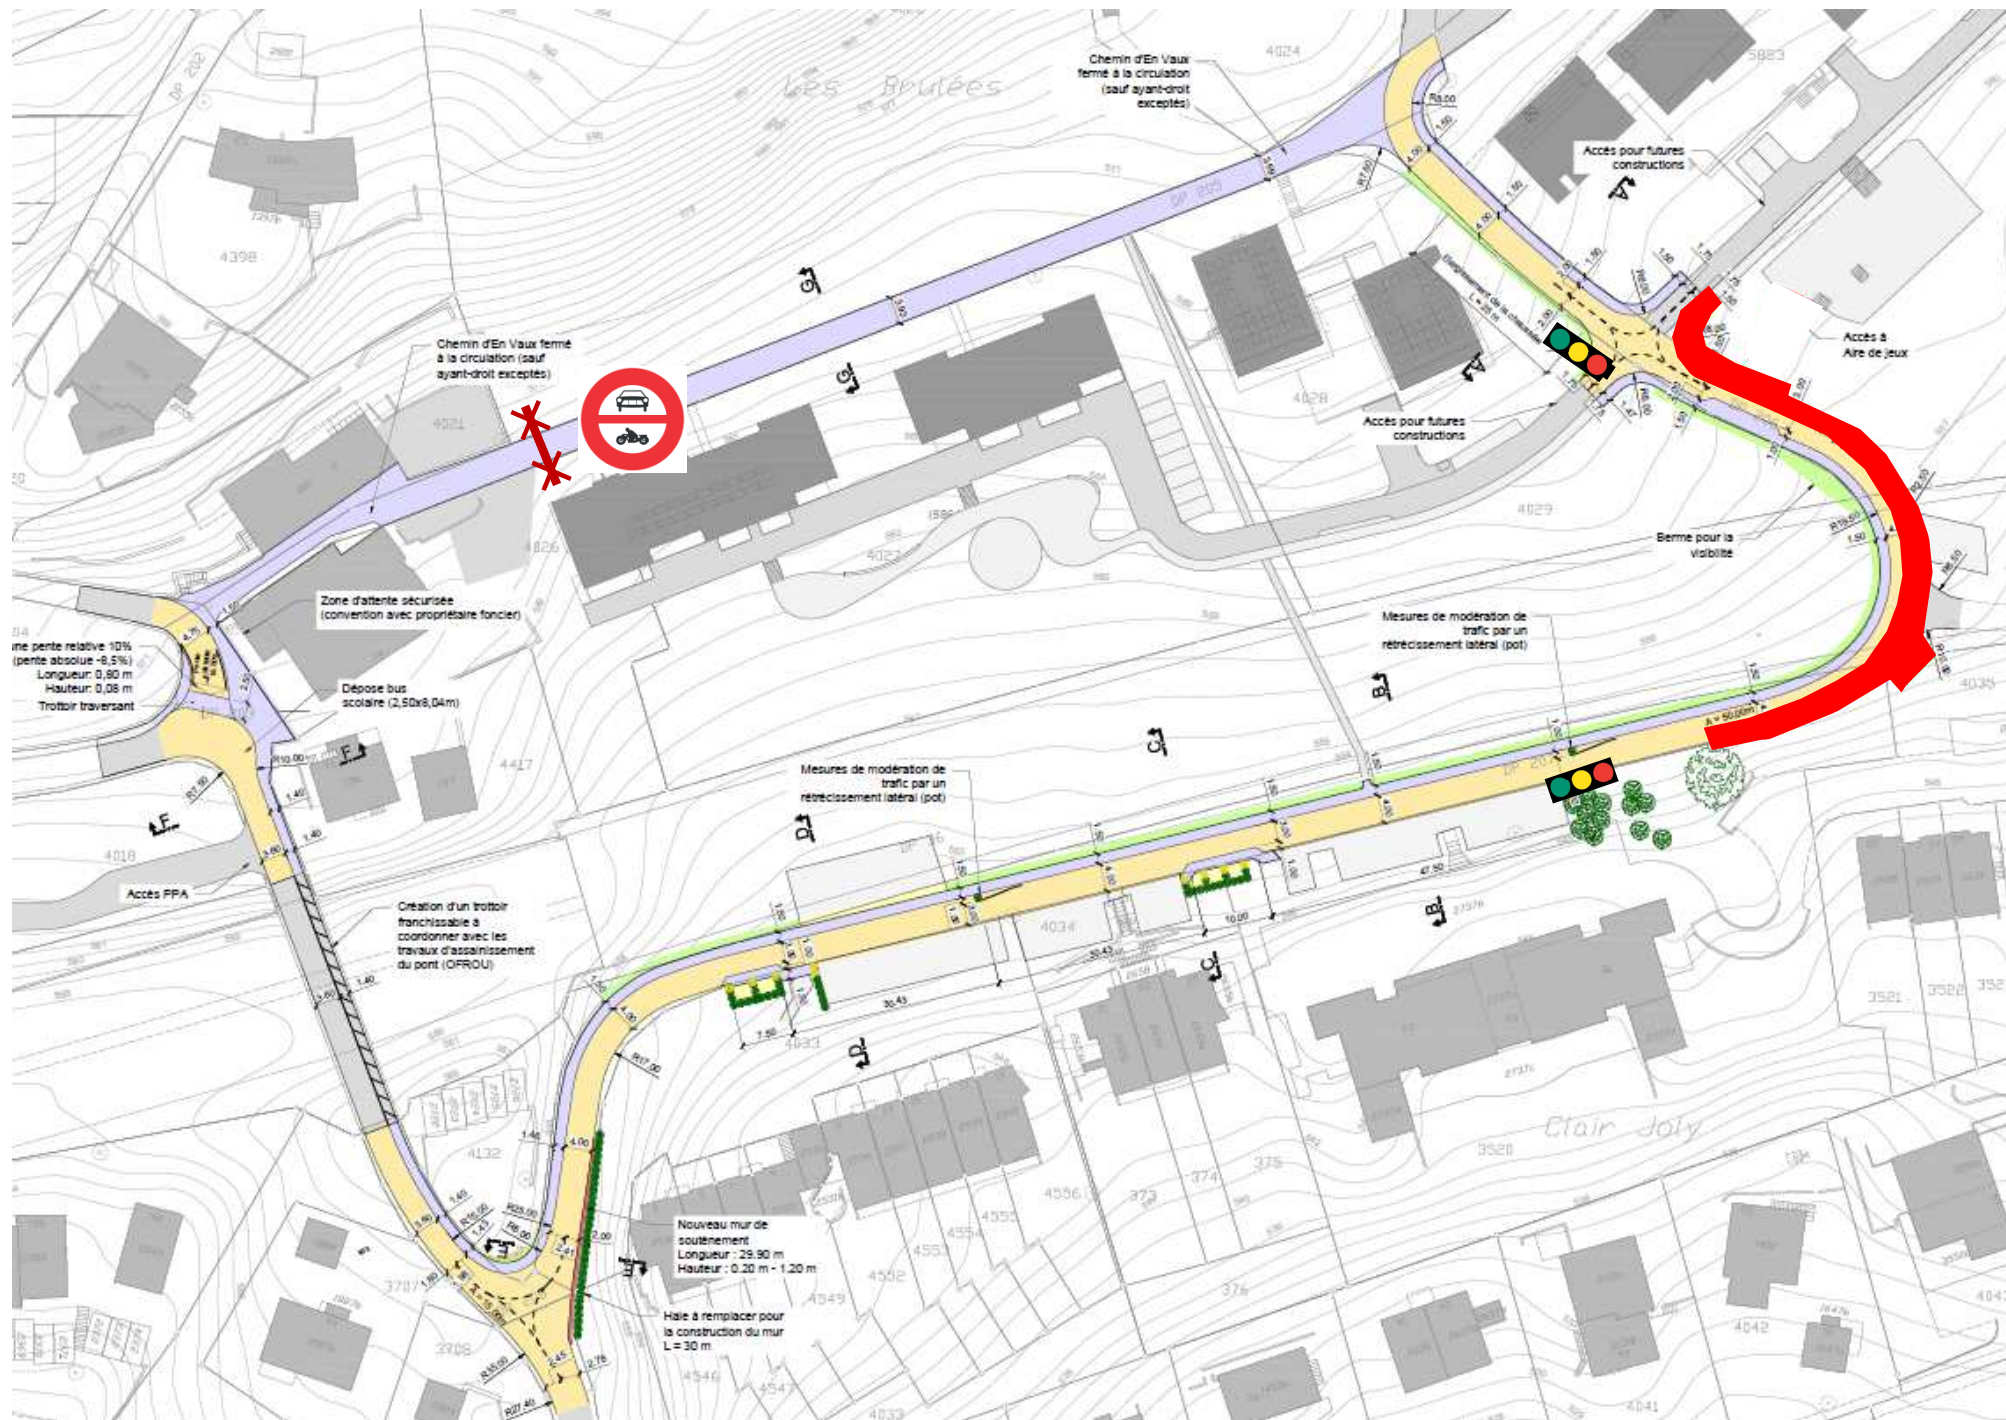







Phasage


Phase 4.1 + 5.1

Durée : 3 semaines

*du 5 octobre 2020
au 23 octobre 2020
(dates approximatives)*

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée
-  Circulation unidirectionnel

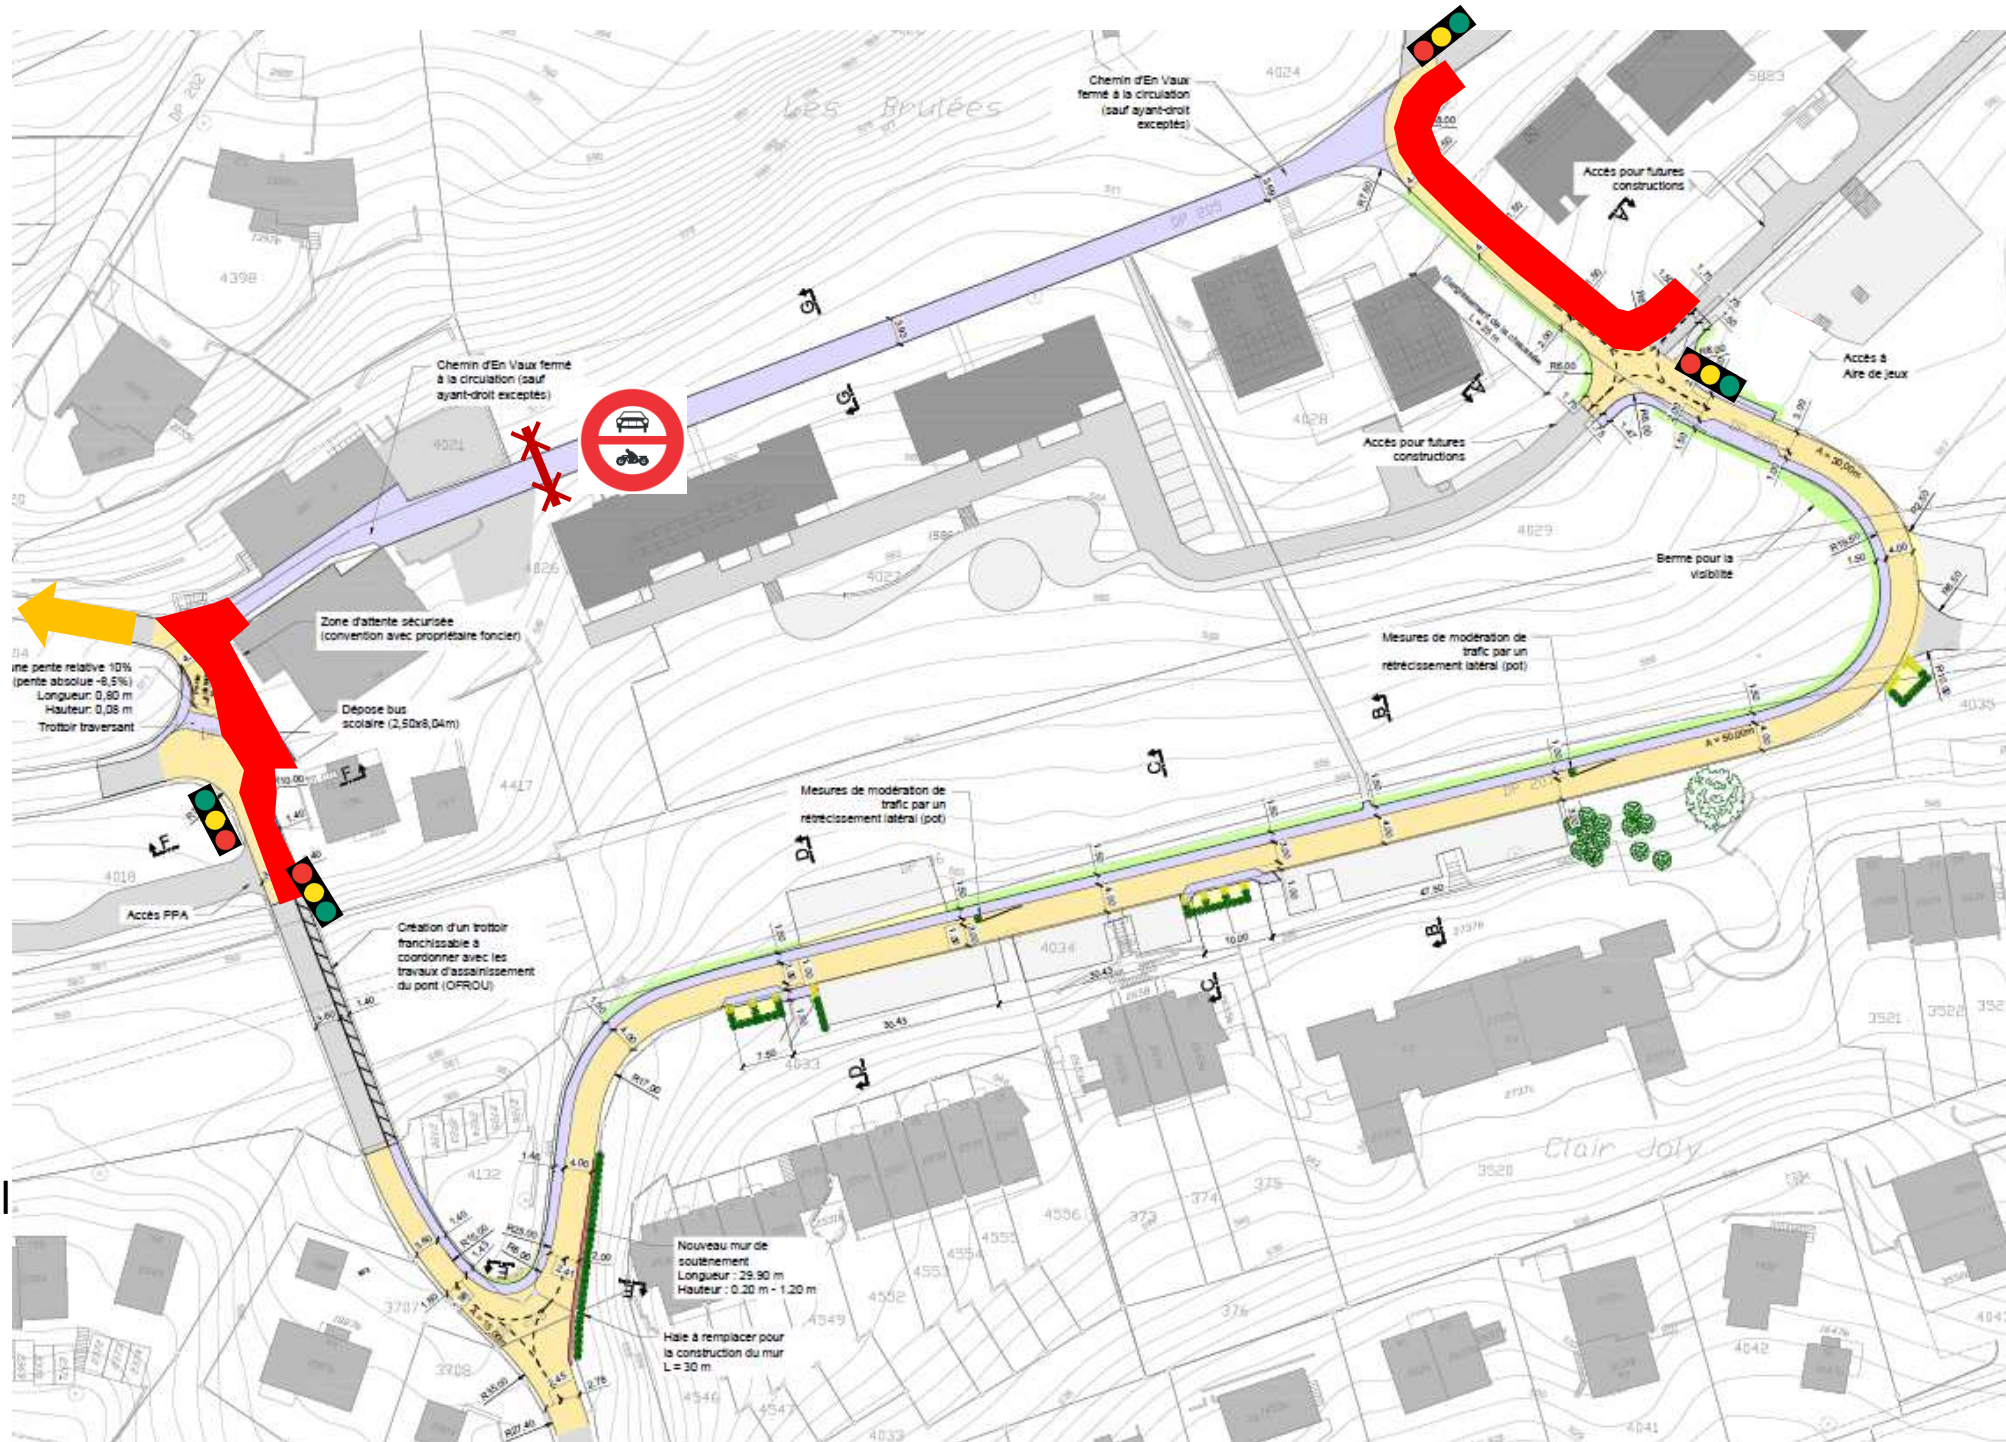







Phasage


Phase 4.2 + 5.2

Durée : 3 semaines

*du 26 octobre 2020
au 13 novembre 2020
(dates approximatives)*

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée
-  Circulation unidirectionnel

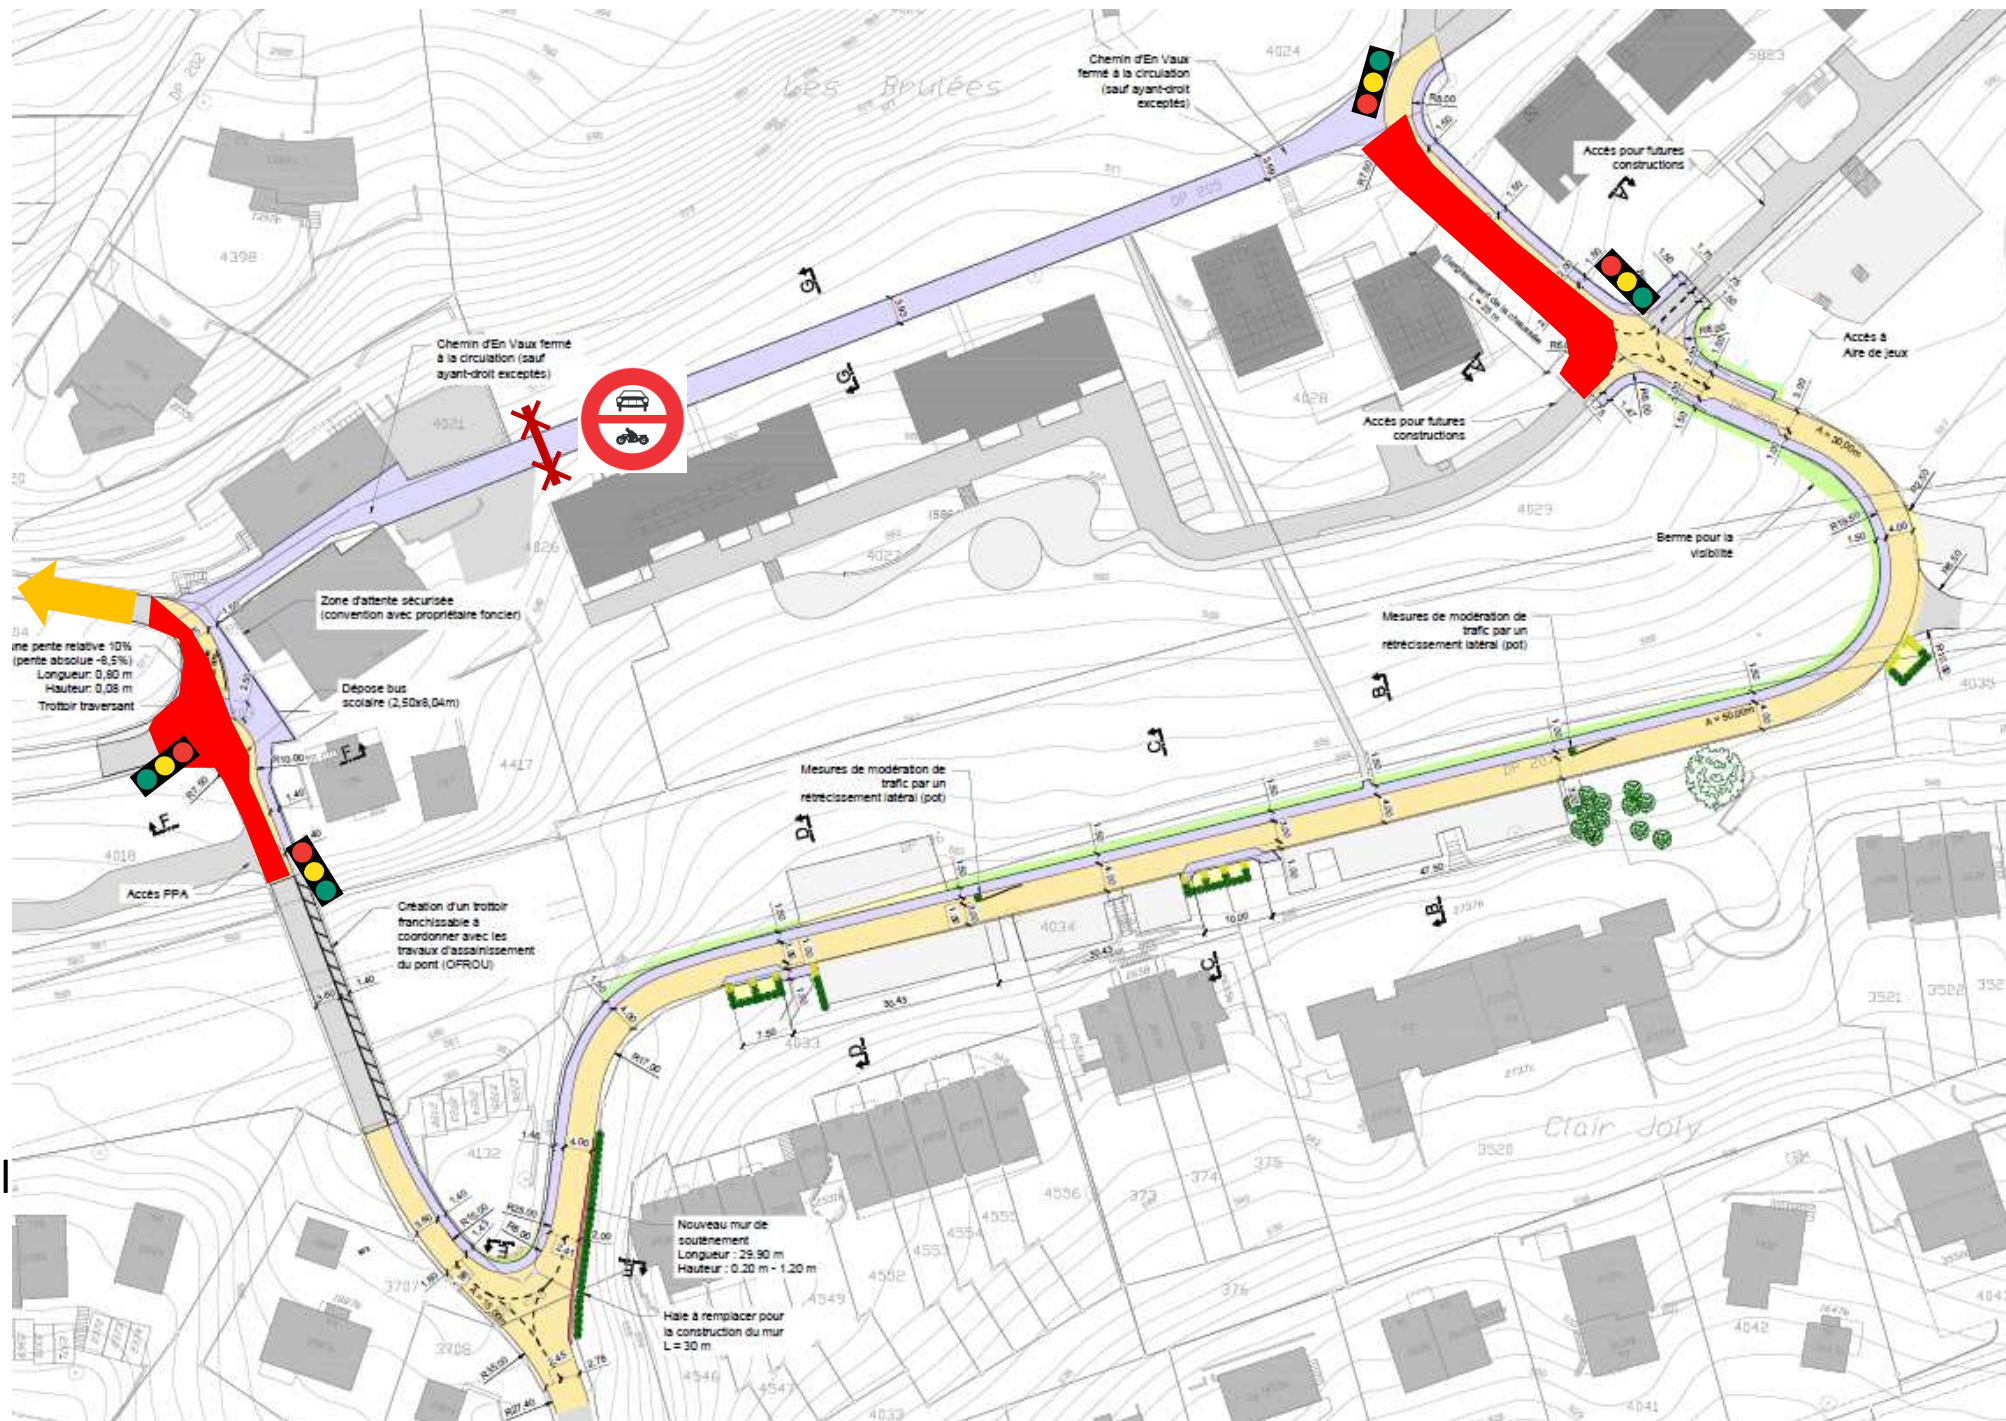



Phasage




Phase 7.1 (Ecopoint)


Durée : 7 semaines

*du 19 octobre 2020
au 4 décembre 2020*

(dates approximatives)

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

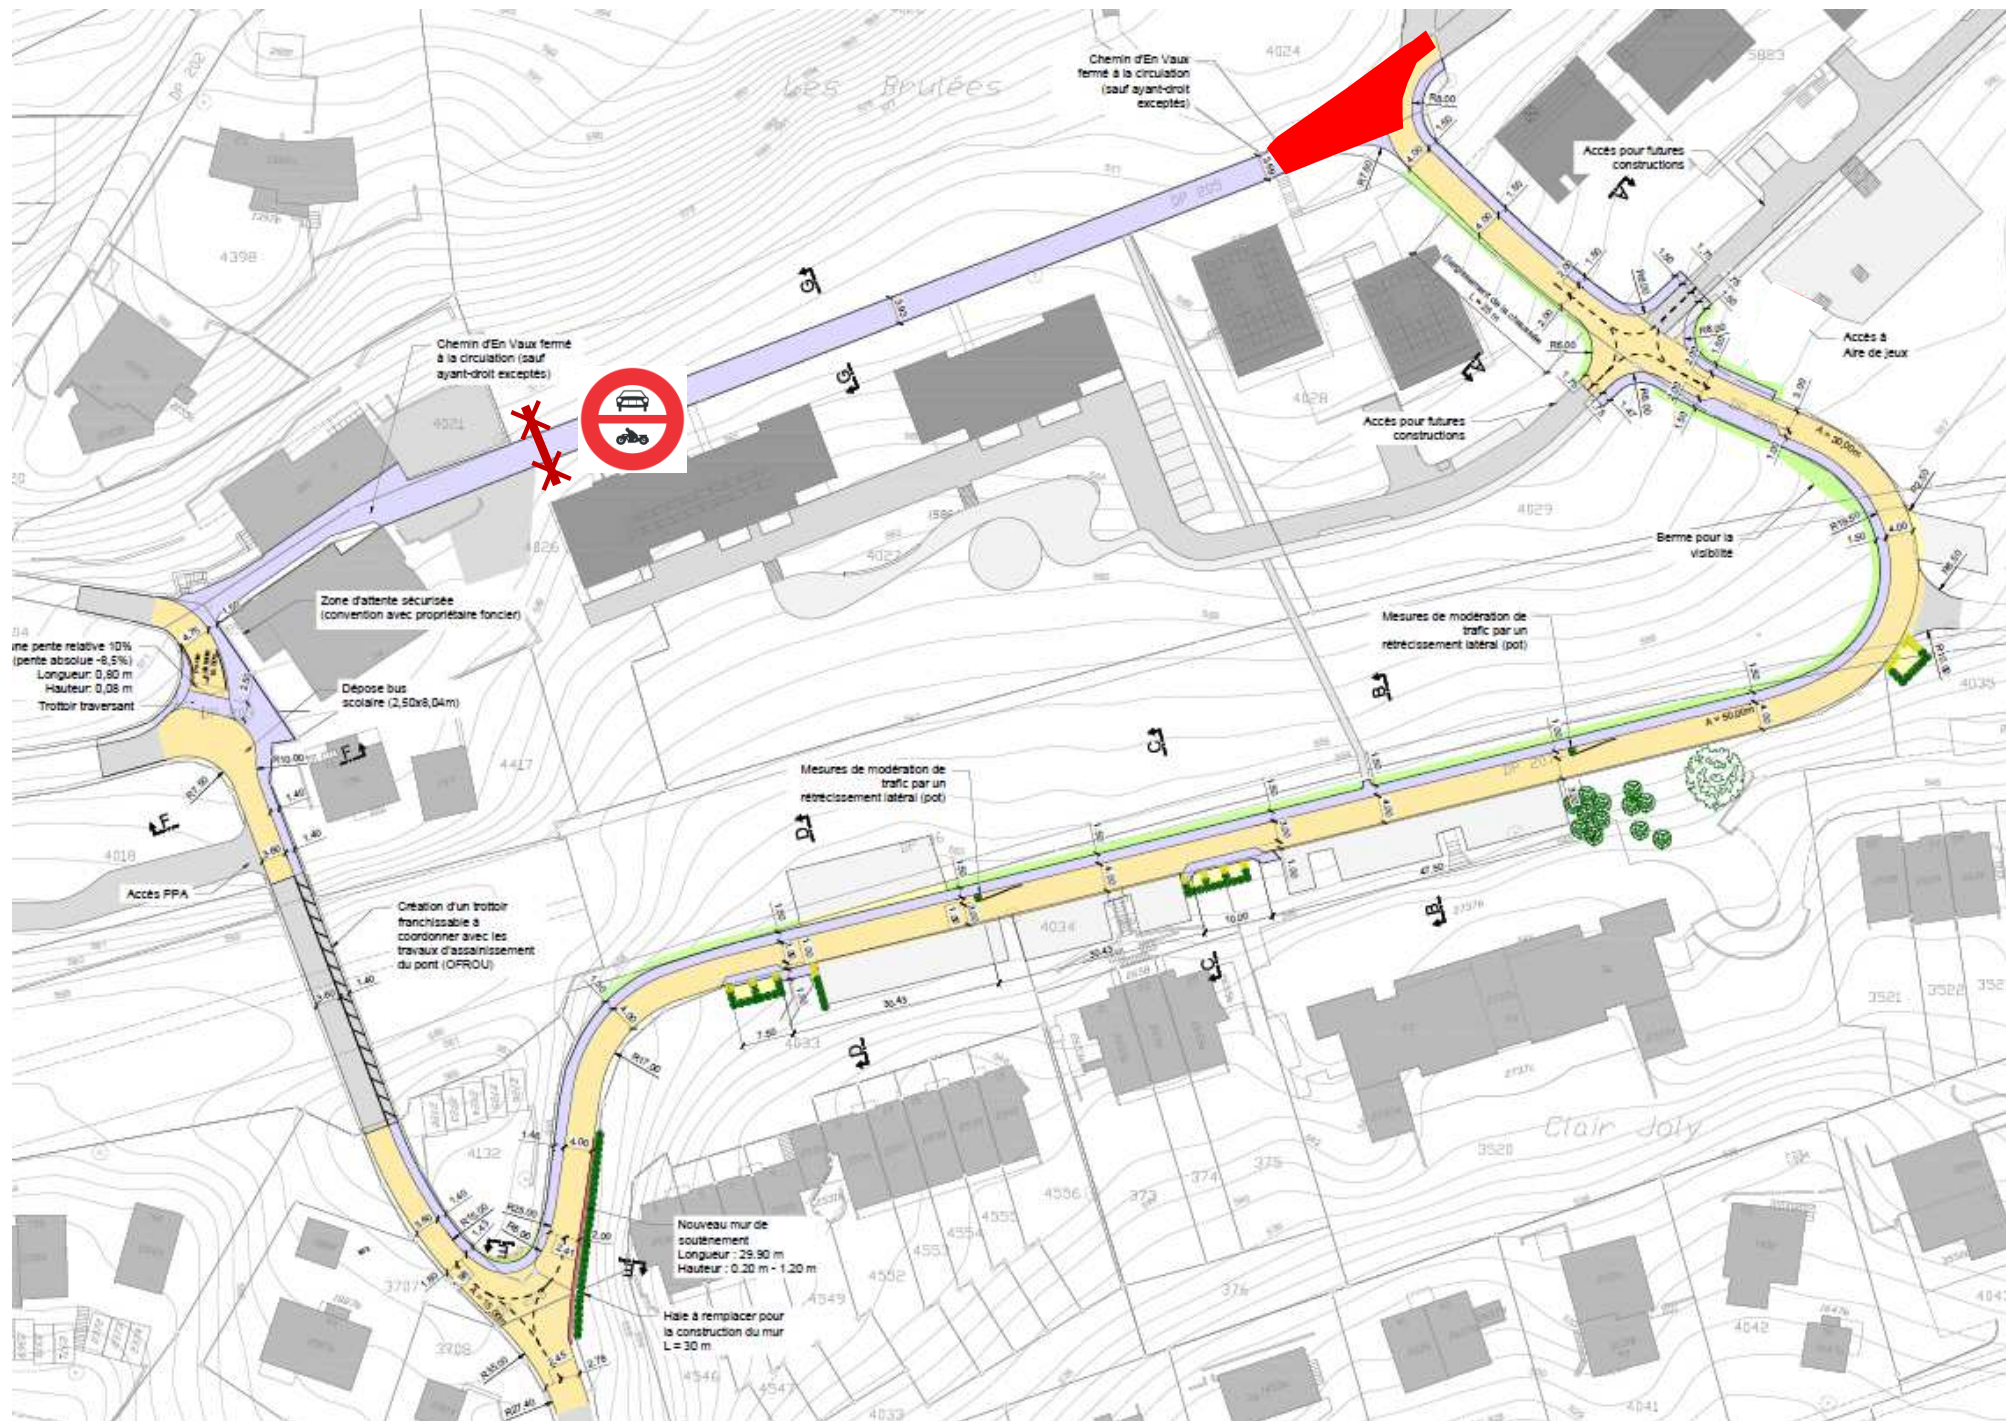



Commune
de Lutry

Phasage




Phase 6.1


Durée : 2,5 semaines

*du 16 novembre 2020
au 2 décembre 2020*

(dates approximatives)

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

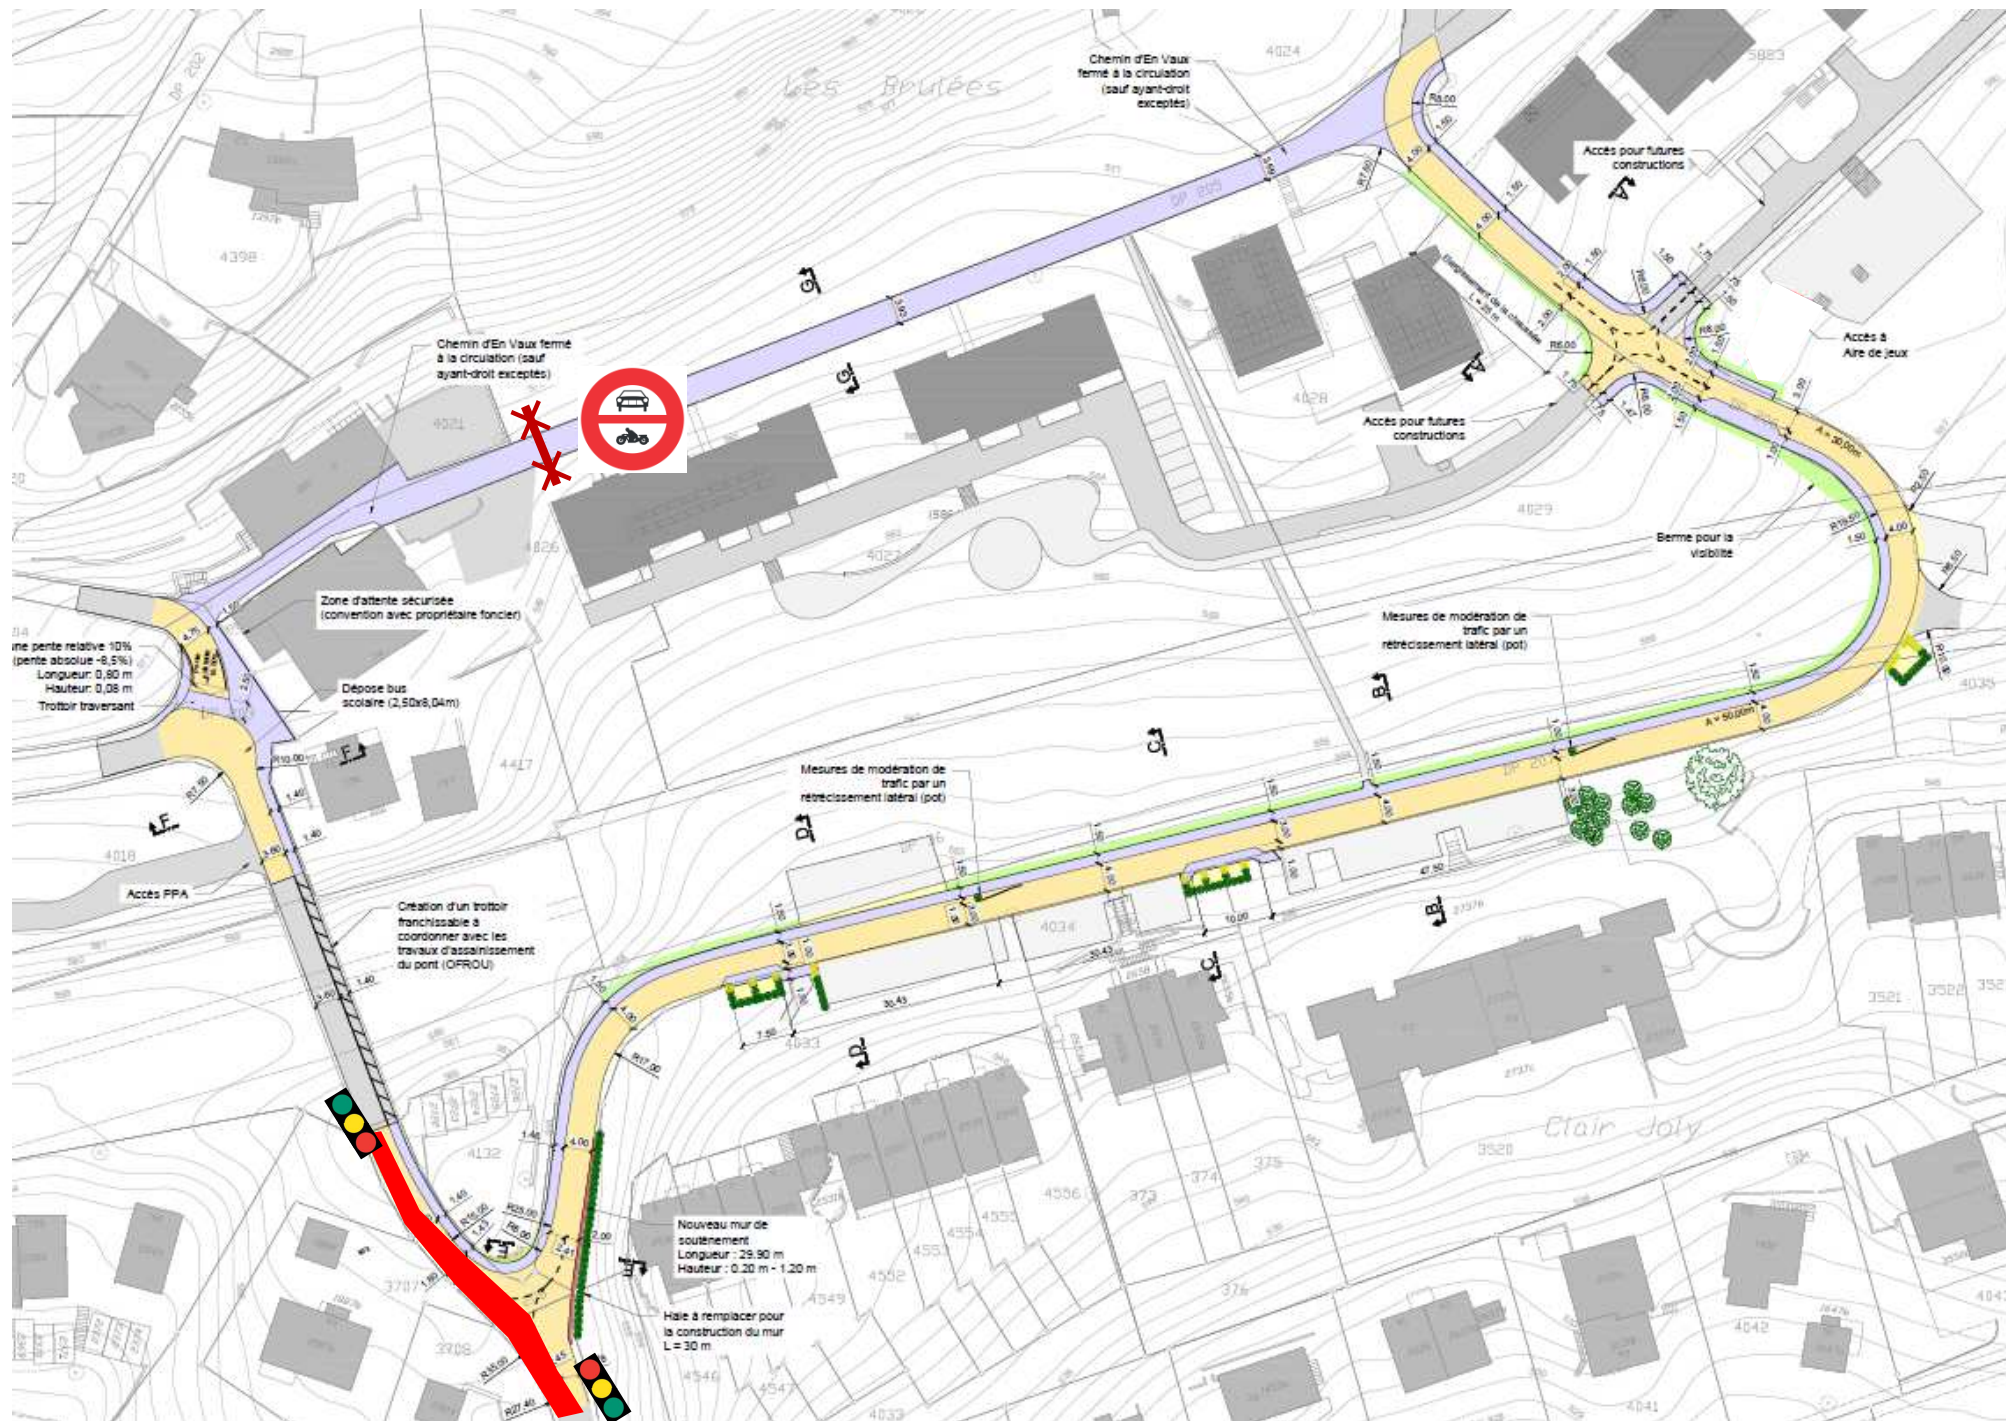



Commune
de Lutry

Phasage




Phase 6.2


Durée : 2,5 semaines

*du 3 décembre 2020
au 18 décembre 2020*

(dates approximatives)

Légende:

-  Travaux
-  Feu de circulation
-  Route fermée

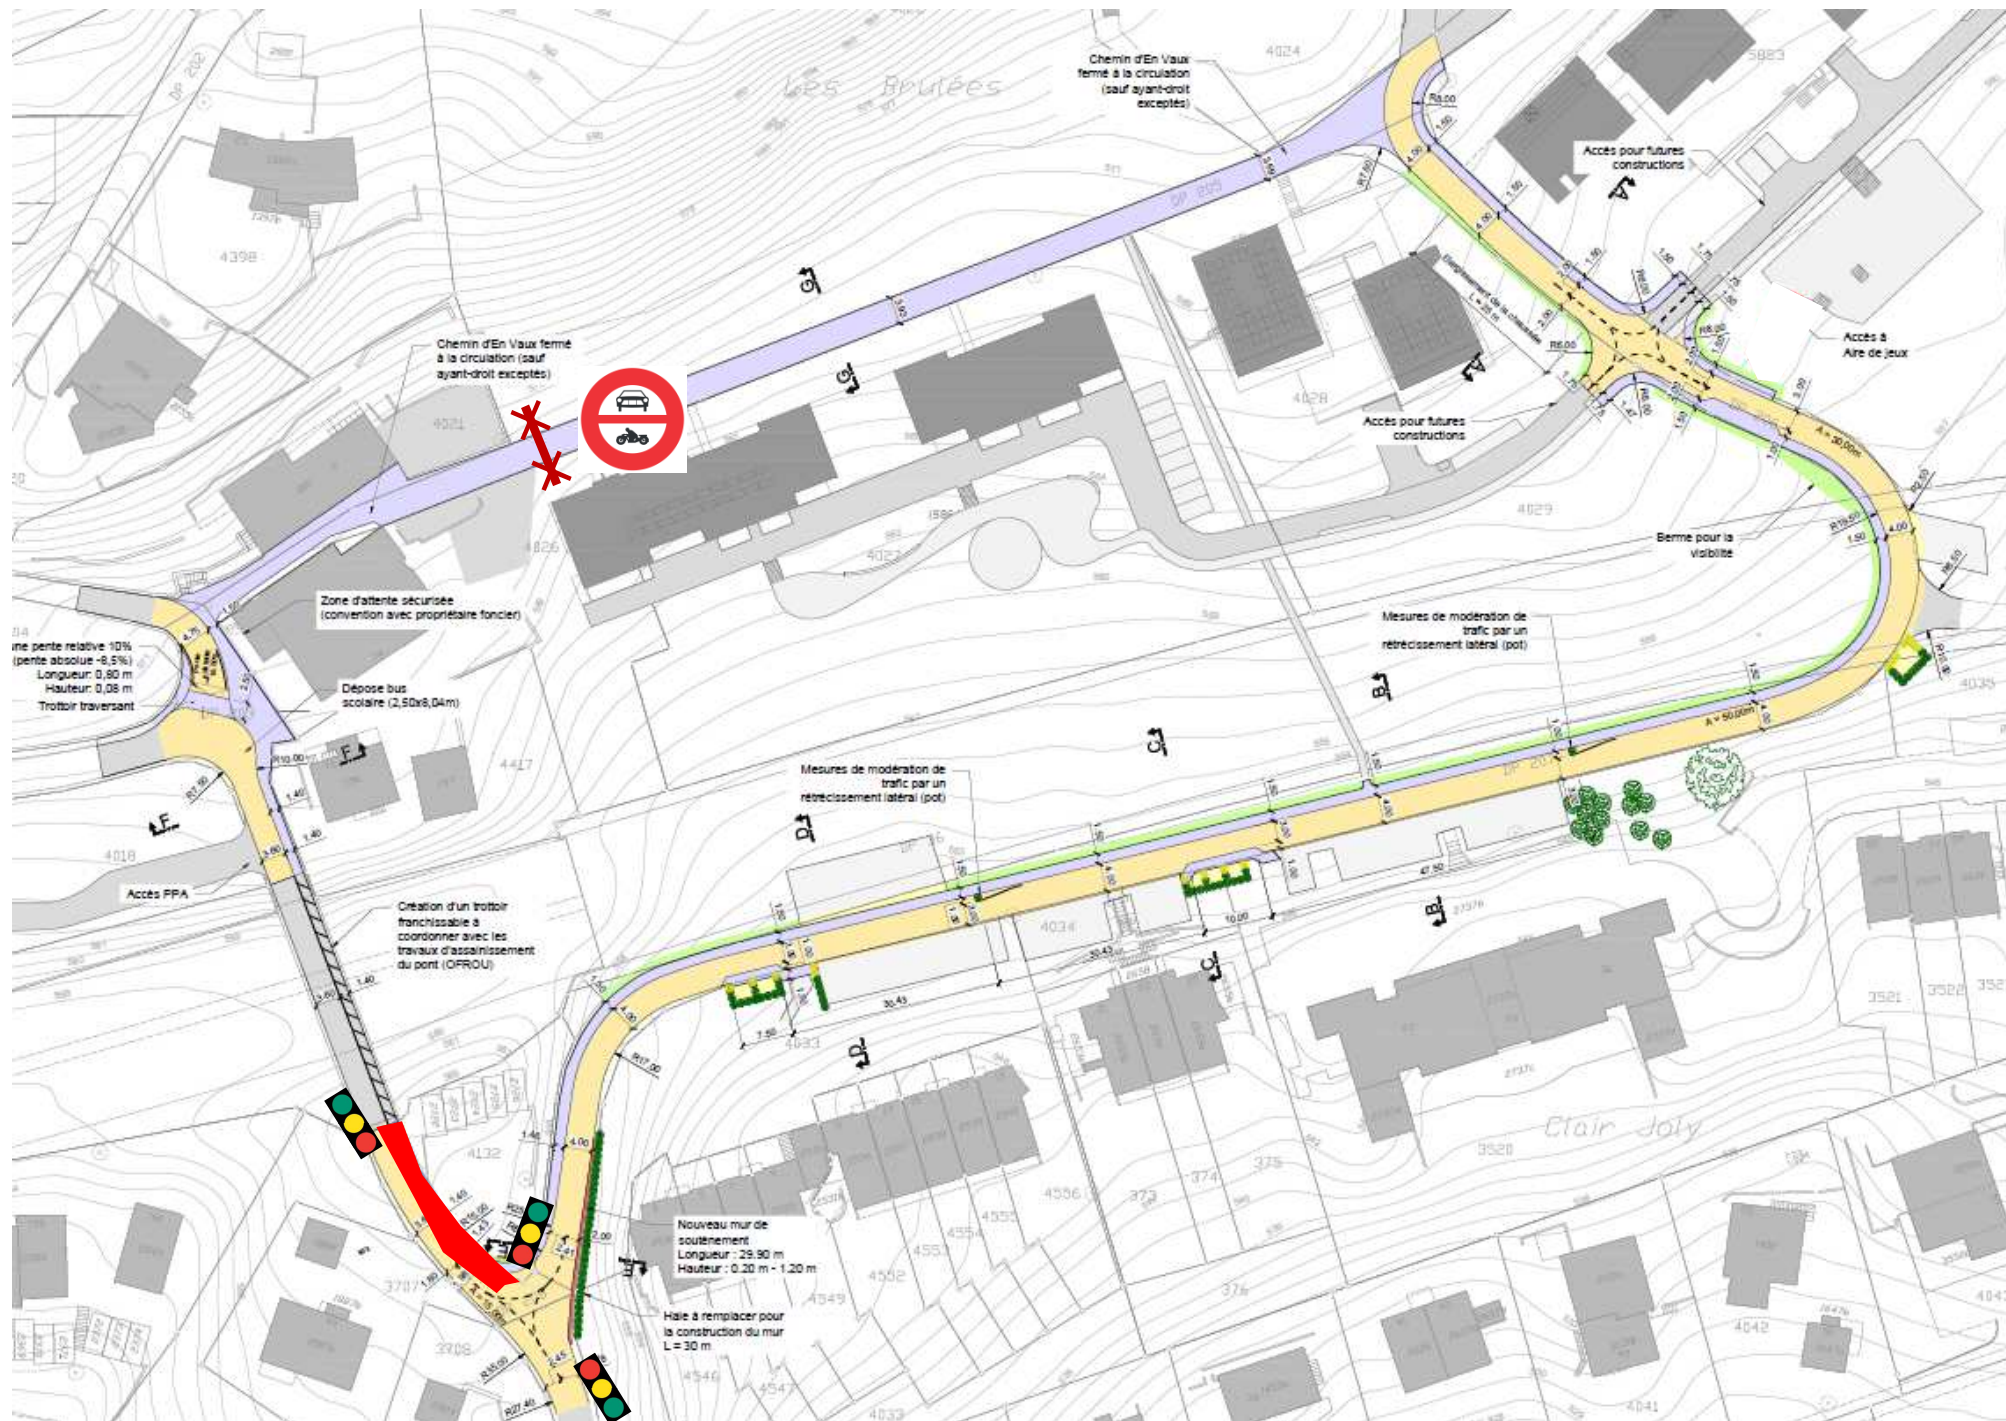



Commune
de Lutry

Phasage

Phase 7.2


Durée : 5 semaines

*du 12 novembre 2020
au 18 décembre 2020*

(dates approximatives)

Légende:

 Travaux

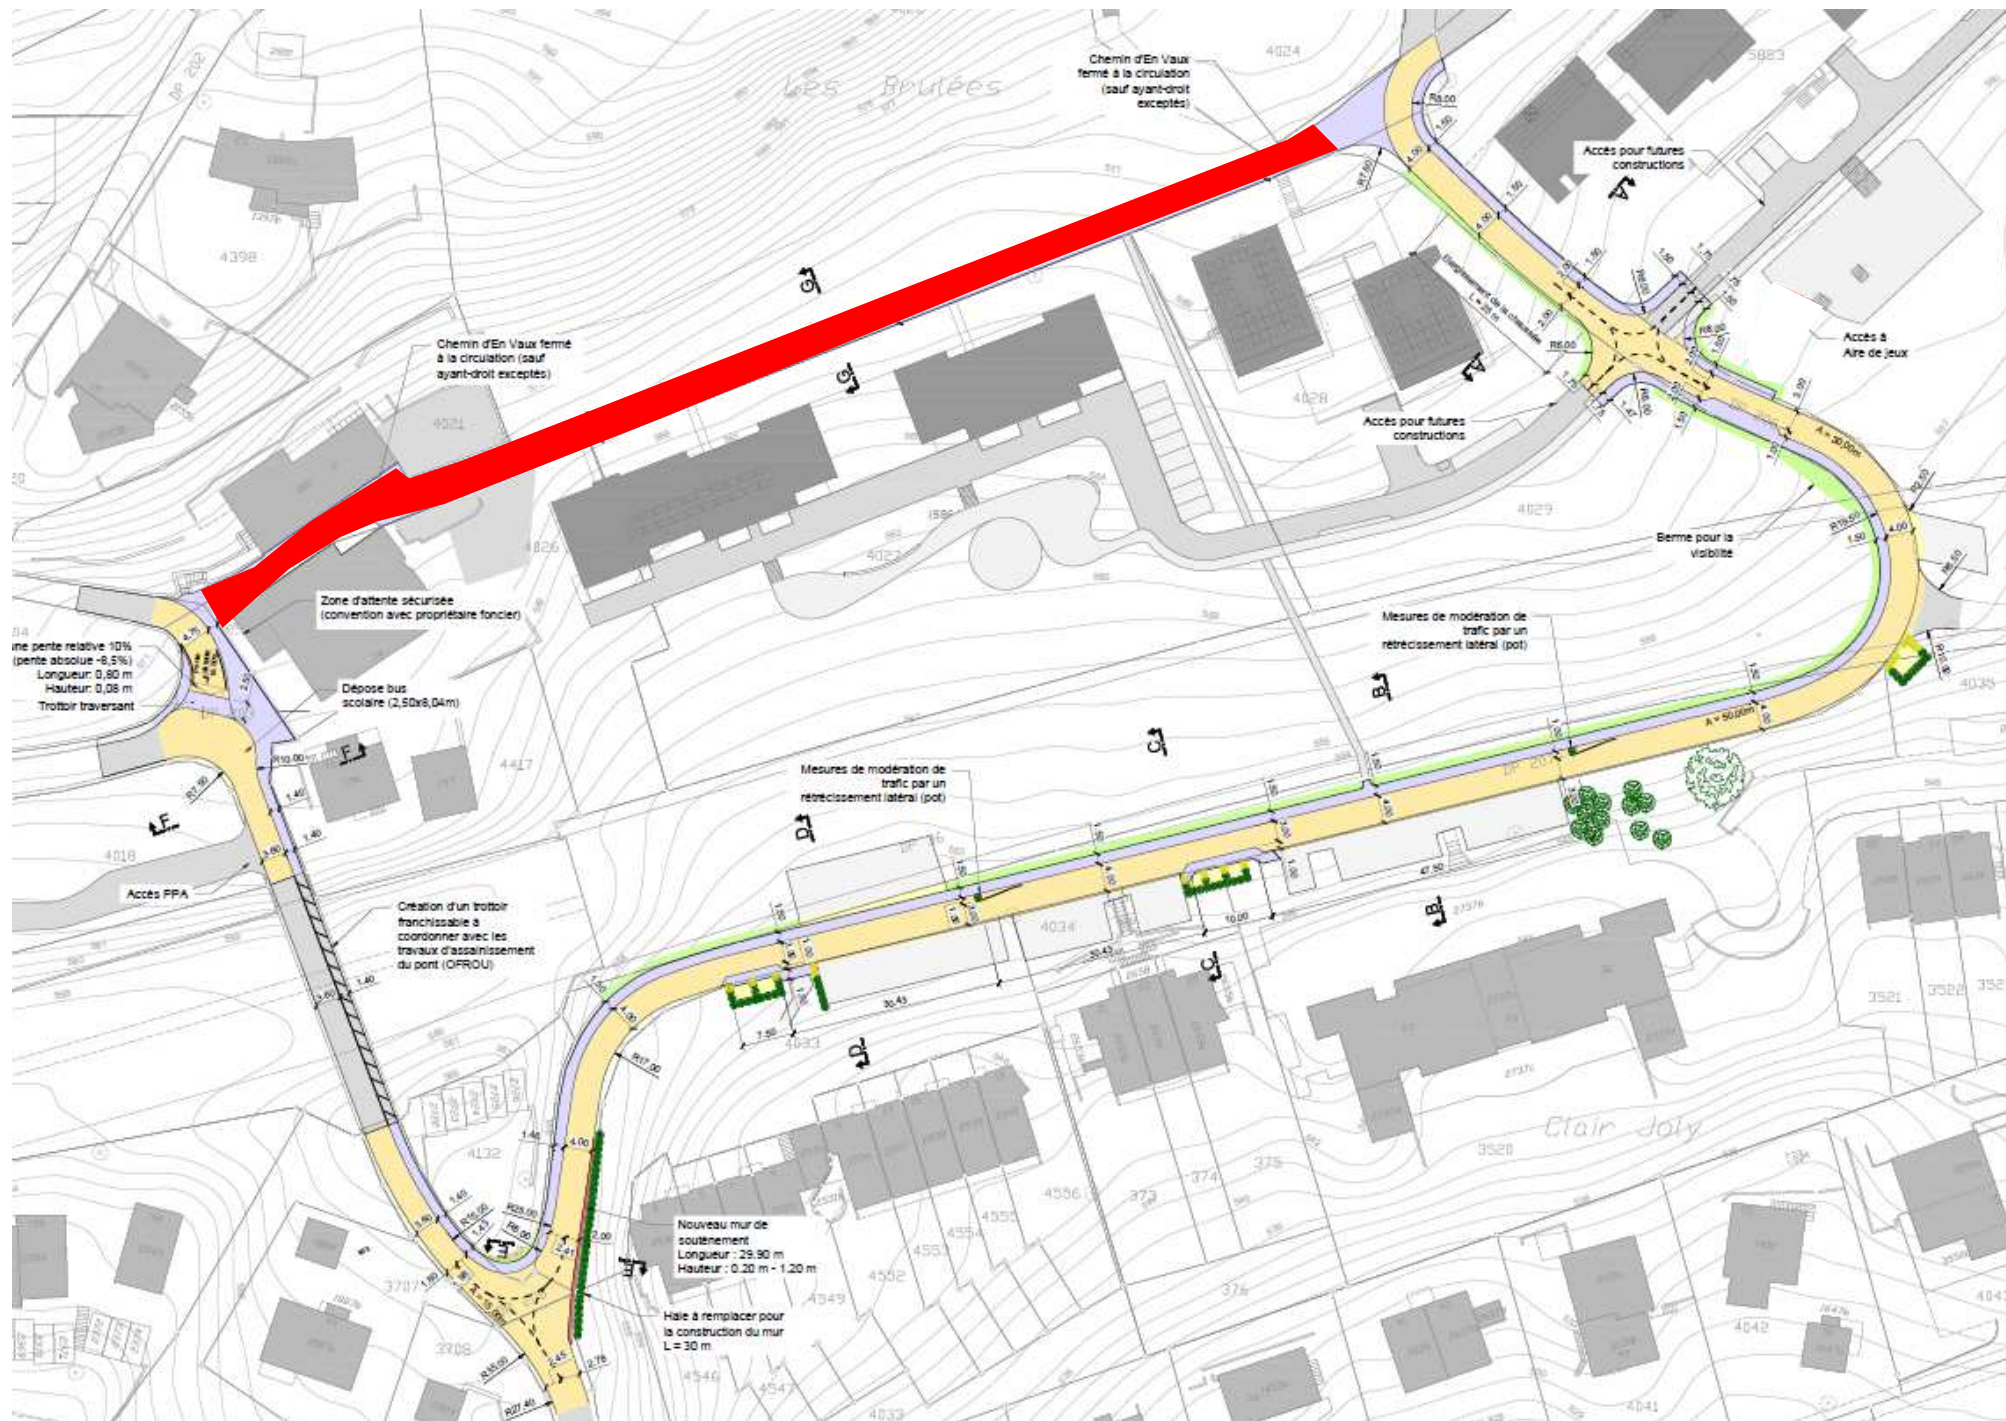



Commune
de Lutry

Phasage

Phase 10
(mai ou juin 2021)

Pose du tapis définitif

Durée : 1 semaine

